

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
2차 공사 실시설계용역 준공																	
2차 공사 착공 및 준공																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'17	○ 산성로 위험도로 구조개선사업 추진계획 수립 ○ 1차, 2차, 3차 사전 심의 위원회 개최	
'19	○ 생태자연도 등급조정(1등급→2등급) 협의완료 ○ 도로구역결정고시 제2019-92호(10.16) ○ 분할측량(한국국토정보공사)	
'20	○ 토지 수용(보상협의 및 보상금 지급)	
'21	○ 1차 공사 착공 L=457m, B=6~8m	
'22	○ 1차 공사 준공 L=457m, B=6~8m ○ 문화재 현상변경 심의 ▶ 심의결과 : 불허 ○ 2차 공사 실시설계용역 ○ 2차 공사 착공	
'23~'24	○ 2차 공사 시행(L=1,943m) 및 준공(05.08.)	

6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

7. 향후 추진계획


- 위험도로 구조개선 사업 추가 발굴

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

공사구간 위치도

○ 위치도 : 화명동 산성로 산199-4번지 ~ 화명동 산7번지 일원

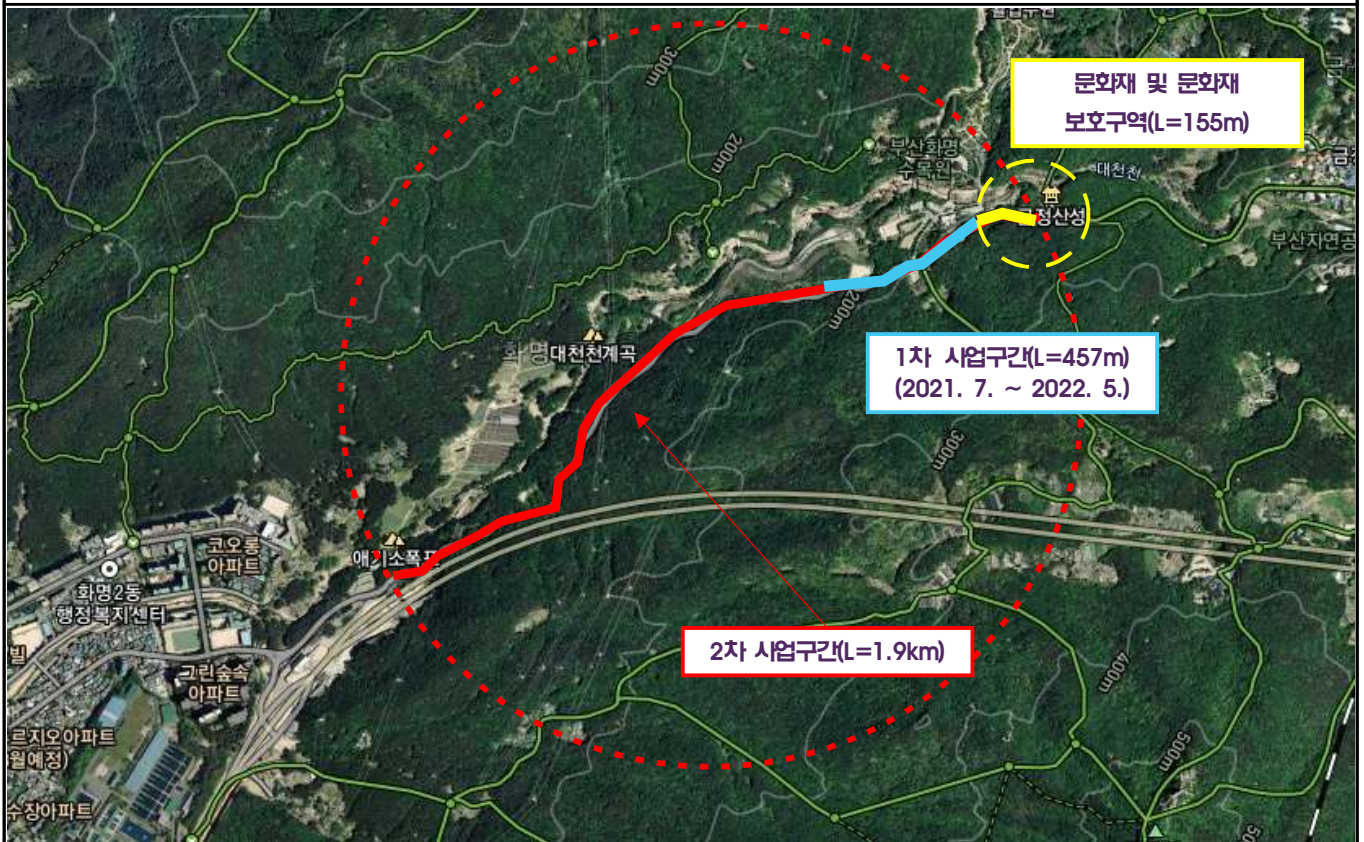

현장 사진



개선 전



개선 후(보도폭 확장 및 옹벽설치)



개선 전



개선 후(보도폭 확장 및 옹벽설치)



개선 전



개선 후(보도폭 확장 및 측구설치)

현장 사진



개선 전



개선 후(보도폭 확장 및 옹벽설치)



개선 전



개선 후(보도폭 확장 및 옹벽설치)



개선 전



개선 후(보도폭 확장 및 측구설치)
