

덕천역 일원 보행환경개선사업

주관 부서	교통행정과 교통기획팀		협조 부서	건설과 토목팀		작성기준 2025.3.31.
	오정미(4552)			강시영(4692)		
완료시기		계속성	사업주체		타기관 협조사항	
(임기내)		(계속)	(구)			
사업기간		총 사업비		추진상황	이행률	
2021 ~ 2024		800백만원		완료	100%	

1. 정책목표

- 덕천시장~젊음의 거리~구포시장 연계한 보행 네트워크 구축

2. 사업개요

- 추진기간 : 2021. ~ 2024.
- 사업위치 : 북구 금곡대로 7번길 35 일원
- 사업규모 : 3개 노선, A=22,000㎡, L=454m, B=5~11m
- 사업내용 : 보행환경개선(패턴형 도막포장, 스마트 버스승강장 설치 등)
- 소요예산 : 800백만원(시비 600, 구비 200)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역 준공																	
공사 착공 및 준공																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20.	○ 공모사업 선정(행정안전부)	
'21.	○ (일부 구간) 실시설계용역 준공	
'23.3	○ 사업대상지 확대(덕천시장 주변~덕천역 일원) ○ 추진계획 수립	
'23.4	○ 보행사업 추진기획단 및 주민협의체 구성	
'23.6	○ (확대 구간) 실시설계용역 시행(2023. 5. ~ 8.) ○ 공약사항 변경에 대한 공약자문단 자문의견 수렴	
'23.7	○ 보행사업 추진기획단 및 주민협의체 개최 ○ 부산시 설계자문 실시	
'23.9~10	○ 관계기관 협의	
'23.12	○ 실시설계 용역 준공 및 공사 착공	
'24.6~8.	○ 공사준공 및 교통안전 시설물 추가 설치	

6. 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

7. 향후 추진계획

○ 시설물 관리 철저 및 추가사업 발굴 등

8. 주민 참여[소통] 실적


설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
‘23.7.27/10.5 주민협의체 회의		‘23.8월 초 市 보행환경개선사업 설계자문		

공사구간 위치도 및 사업 전·후 사진

○ 위치도



사업 전

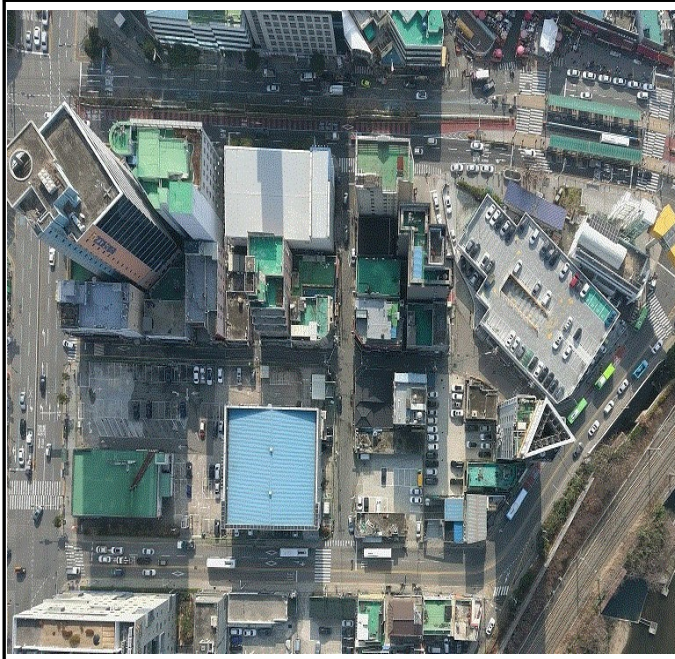

사업 후




현장 사진




개선 전(좁은 보도폭, 노후 승강장)



개선 후(보도폭 확장 및 스마트승강장 설치)

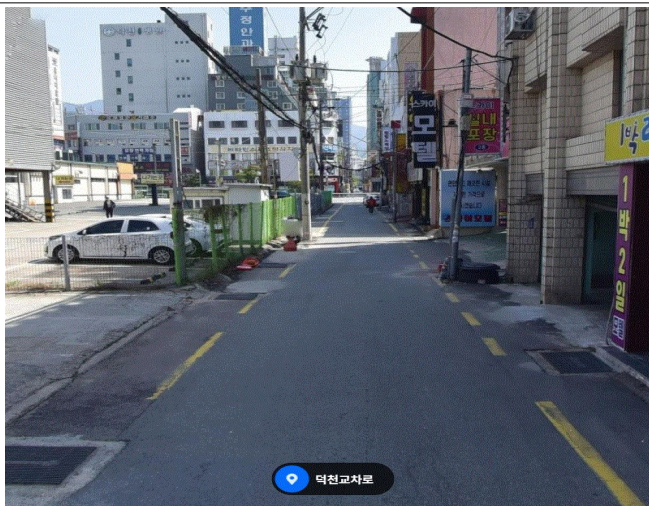

개선 전

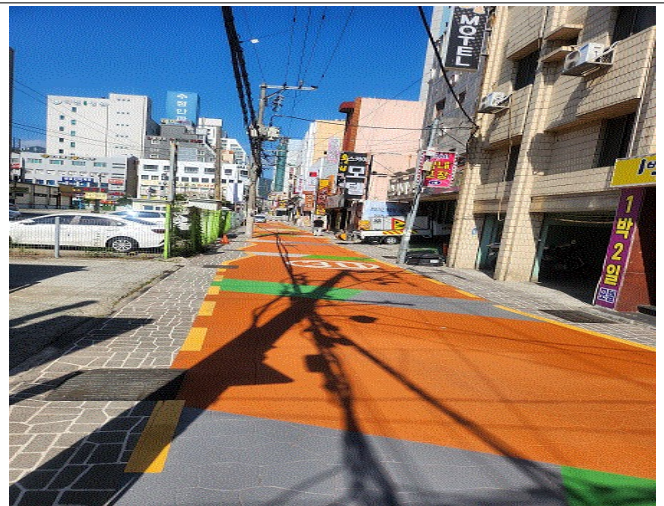

개선 후(패턴형 블록포장)



개선 전



개선 후(무단횡단방지 차선분리대 설치)
