

만덕동 주택밀집지역 공영주차장 건립

1. 정책목표

- ## 2. 사업개요

- ### 3. 연도별 소요예산

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획수립																	
공유재산심의 등 행정절차 및 부지매입																	
설계 등 각종용역																	
주차장 조성공사																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23.1분기	○ 사업계획수립(만덕2동 백양중학교 건립사업 대상지 변경 추진) ○ 사업대상지 변경 관련 상급기관 승인 ○ 공유재산심의, 지방재정투자심사	
'23.2분기	○ 부지매입(사유지) 계약체결 및 가등기	
'23.4분기	○ 소유권 이전등기 등	
'24.1분기	○ 남산정공영주차장 주민설명회 개최 및 설계용역 완료 ○ 건축물 해체 및 설계용역 완료	
'24.2분기	○ 백산공영주차장 주민설명회 개최 및 설계용역 완료 ○ 공사 착공	
'24.3분기	○ 백산공영주차장(만덕3로 48번다길 21) 건축물 해체 ○ 남산정공영주차(만덕3로 16번길 54) 토목 구조물 설치	
'24.4분기	○ 남산정공영주차(만덕3로 16번길 54) 준공 ○ 백산공영주차장(만덕3로 48번다길 21) 준공	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 공영주차장 운영 중

8. 주민 참여(소통) 실적


설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
2024.1.12.(남산정공영) 2024.5.2.(백산공영)				

만덕동 주택밀집지역 공영주차장 건립

위 치 도



현장사진

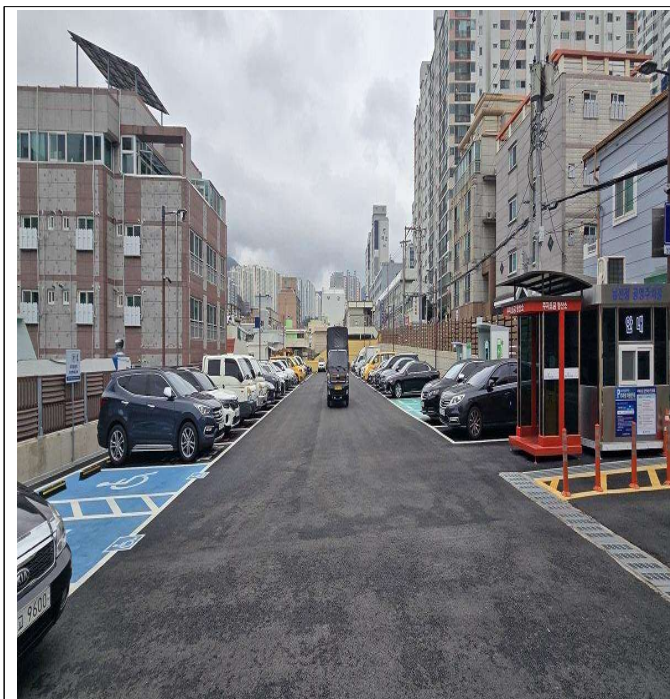

남산정공영주차장



백산공영주차장
