

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
신청사 입지 확정	■	■	■	■													
타당성 조사 및 기본계획 용역				■	■	■	■	■									
행안부 타당성조사 및 중앙투자심사								■	■	■							
설계공모													■	■			
기본 및 실시설계 용역													■	■	■	■	
공사착공 및 시행																■	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 후보지 전면 재검토(관련기관 협의 등) ○ 신청사 건립 추진위원회 개최 : 1회 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 건립 추진위원회 개최 : 5회 ○ 신청사 건립 예정지 선정 ○ 신청사 건립 기금 적립 : 71,226백만원 ※ 2023년 34,502백만원 ○ 용역 발주 : 5건(기본계획 수립 및 타당성 조사, 도시관리계획 결정 등) ○ 현 청사 정밀안전점검 및 구조안전성 검토 용역 준공 	
'24	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재해영향성 검토 용역 준공 ○ 행정안전부 타당성조사 실시 및 완료 ○ 사업 부지 일부 기부협약 체결 ○ 도시관리계획(시설:공공청사) 결정 ○ 2024년 신청사 건립 기금 적립 : 35,772백만원 ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 준공 ○ 전략환경영향평가 협의내용 반영결과 통보 ○ 전략환경영향평가 용역 준공 ○ 신청사 건립부지 분묘조사 용역 준공 ○ 신청사 설계공모 관리용역 준공 ○ 행정안전부 지방재정투자심사 결과 : 조건부 통과 ○ 신청사 건립 공사 설계 공모 	

연도	추진내용	비고
'25	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 건립부지 지적분할 용역 준공 ○ 신청사 건립 공사 국제 설계 공모 및 선정 ○ 신청사 건립부지 지형현황 측량 용역 준공 ○ 신청사 건립 공사 기본 및 실시설계 용역 실시 ○ 신청사 건립부지 산림조사 용역 준공 ○ 신청사 건립사업 1차 별목공사 준공 ○ 신청사 부지 내 지반조사 용역 준공 ○ 신청사 건립부지 매장유산 표본조사 용역 준공 ○ 신청사 건립사업 부지 보상 계획 공고 ○ 신청사 건립사업 교통영향·지하안전·재해영향평가 용역 실시 중 ○ 2030년 부산도시관리계획(재정비) 결정: 자연녹지지역 →제2종주거지역 ○ 신청사 건립사업 2차 별목공사 준공 ○ 신청사 건립사업 프로세스 관리 용역 실시 중 ○ 신청사 주 진입도로 공사 중 ○ 신청사 건립 부지 내 인공암벽장 해체공사 중 ○ 사업인정(의제)사업 공익성 심의 통과 ○ 도시계획시설(공공청사)사업 실시계획 고시 	
'26	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 건립공사 자재 선정 및 관리 지침 마련 ○ 북구 신청사 건립사업 소규모 재해영향평가 용역 준공 ○ 신청사 건립 부지 내 인공암벽장 해체공사 준공 ○ 북구 신청사 건립사업 무연분묘 개장공고 (1·2차) ○ 북구 신청사 설계의 경제성 등 검토(VE) 완료 ○ 2026년도 제1차 신청사건립자문단 회의 개최 ○ 무연고 묘지 개장 전 합동위령제 개최 ○ 북구 신청사 건립사업 교통영향평가 용역 준공 	

6. 향후 추진계획

- 2026년 상반기 시공사 선정

7. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
16회	1회	17회	48회	-

- ※ 2026. 1. 12.(월) 부산 북구 신청사, 북구의회 설명회 통해 진행 과정 공유(언론보도)
- ※ 2026. 3. 16.(월) 2026년도 제1차 신청사건립자문단 회의 개최
- ※ 2026. 3. 20.(금) 부산 북구, 신청사 건립 부지내 무연고 분묘 개장을 위한 합동위령제 개최(언론보도)

사업추진 관련 사진 (위치도, 조감도, 현장사진 등)



4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
버스정류장 냉온열 대기의자 확충																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 냉·온열의자 10개소, 온열의자 8개소 설치	
'23	○ 온열의자 32개소 설치 - 2월 : 금곡주공3단지 등 4개소, 한파재난대비 - 3월 : 수정강변타운 후문 등 12개소, 구비 - 4월 : 경남아파트 등 4개소, 주민참여예산 - 5월 : 만덕그린코아 1개소, 구비 -10월 : 만덕1동행정복지센터 등 11개소, 자치단체자본보조금	
'24	○ 온열의자 12개소 14개 설치 - 4월 : 이노비즈센터 등 8개소 10개, 구비 -12월 : 화잠초등학교 등 4개소 4개, 구비	

6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

7. 향후 추진계획

- 시설물 관리 철저 등

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

현장 사진



동원아파트 입구 정류소



만덕119안전센터 정류소 (08-250)



그린코아아파트 후문 정류소 (08-249)



롯데캐슬카이저남문 정류소 (08-200)



덕양초등학교 정류소(08-255)



동원로얄듀크비스타
구포시장방면(08-202)



화명역 · 화신중(08-204)



화잠초(08-216)



낙동고(08-061)



백양초

주관 부서	교통행정과 교통사업팀	협조 부서			작성기준 2026.3.31.
	박동준(4502)				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023 ~ 2024		1,715백만원	완료	100%	

1. 정책목표

- 구포3동 소규모 주차장 조성, 주차면 27면

2. 사업개요

- 추진기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업위치 : 구포동 1243-1번지(시유지), 1243-3번지(국유지)
- 사업규모 : 693.9㎡, 주차장 27면, 2단(단차활용)
- 사업내용 : 백양산체육공원 인근 유희부지의 경사로 단차를 활용하여 소규모 공영 주차장 조성
- 소요예산 : 1,715백만원(시비 595, 구비 1,120)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내					임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25							
계	1,951		1,951		1,395	556			1,715		1,395	320		
국비									-		-			
시비	595		595		595				595		595			
구비	1,356		1,356		800	556			1,120		800	320		
기타 (민간)									-		-			

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
부지매입 계약			■	■													
설계용역 추진					■	■											
주차장 조성공사							■	■	■	■							

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 2023년 주차시설 확충 추진계획 수립 ○ 공유재산심의 및 재정투자사업 심의	
'23.1분기	○ 세부추진계획수립 ▷ 교통행정과-9181(2023.2.8.)호 ○ 국,시유지 매입의뢰 ○ 구 공유재산심의(변경), 공유재산관리계획 요구, 구비 편성요구	
'23.2분기	○ 구 공유재산관리계획, 구비 일부편성(8억원) ○ 시유지 매입(6.36억원) 완료, 국유지 매입 재의뢰	
'23.3분기	○ 국유지 매입완료(1.6억원) ○ 지반조사 실시, 설계용역 계약	
'23.4분기	○ 설계용역 추진 ○ 주민설명회	
'24.1분기	○ 실시설계 완료 ○ 설비(전기, 소방) 용역 발주	
'24.2분기	○ 공작물 축조 신고 완료 ○ 공사 발주	
'24.3분기	○ 공사 착공 ▷ 터파기 및 철골 구조물 설치	
'24.4분기	○ 공사 준공	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 소규모 공동 주차장 운영 중

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회 민간전문가자문 등	언론·방송보도	기타
2023.12.6.				

구포3동 공영주차장 복합공간 조성

위 치 도



현장사진



4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획수립			■														
공유재산심의 등 행정절차 및 부지매입				■	■	■	■										
설계 등 각종용역					■	■	■	■	■								
주차장 조성공사								■	■	■	■						

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23.1분기	○ 사업계획수립(만덕2동 백양중학교 건립사업 대상지 변경 추진) ○ 사업대상지 변경 관련 상급기관 승인 ○ 공유재산심의, 지방재정투자심사	
'23.2분기	○ 부지매입(사유지) 계약체결 및 가등기	
'23.4분기	○ 소유권 이전등기 등	
'24.1분기	○ 남산정공영주차장 주민설명회 개최 및 설계용역 완료 ○ 건축물 해체 및 설계용역 완료	
'24.2분기	○ 백산공영주차장 주민설명회 개최 및 설계용역 완료 ○ 공사 착공	
'24.3분기	○ 백산공영주차장(만덕3로 48번다길 21) 건축물 해체 ○ 남산정공영주차(만덕3로 16번길 54) 토목 구조물 설치	
'24.4분기	○ 남산정공영주차(만덕3로 16번길 54) 준공 ○ 백산공영주차장(만덕3로 48번다길 21) 준공	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 공영주차장 운영 중

8. 주민 참여(소통) 실적


설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
2024.1.12.(남산정공영) 2024.5.2.(백산공영)				

만덕동 주택밀집지역 공영주차장 건립

위 치 도



현장사진

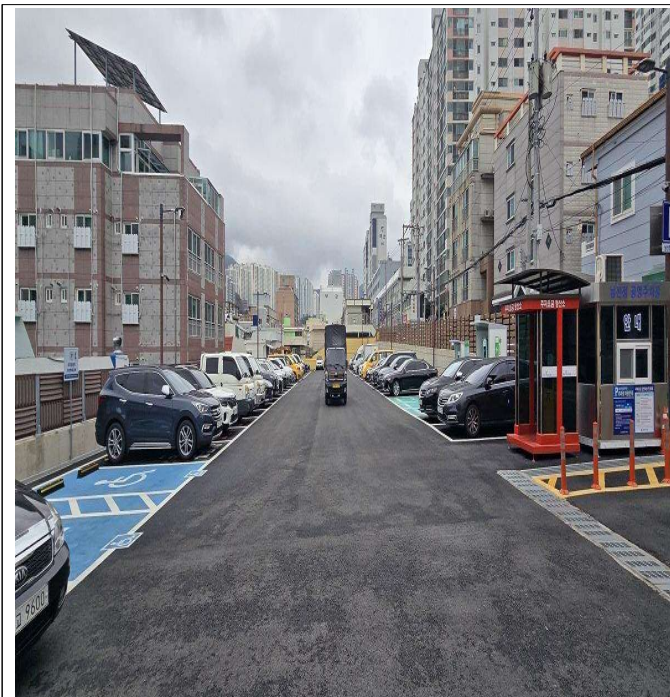

남산정공영주차장



백산공영주차장

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
도시관리계획시설 결정 등 사전절차	■	■															
설계용역 추진			■														
주차장 조성공사				■													

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	○ 중기재정계획 반영	
'21	○ 신규사업 사전심사 조건부 승인 ○ 공유재산 및 지방재정투자심사(원안가결) ○ 공유재산관리계획안 심의(원안가결)	
'22	○ 물소리공원 기부채납(LH ▶ 복구청) ○ 도시관리계획시설 결정(변경) 용역 추진 ○ 주민설명회 개최(▶베르빌아파트 주민 건립반대) ○ 사업대상지 변경, 공유재산 및 지방재정투자심사 변경 심의 ○ 대체부지 매매계약, 대금 일부 납부	
'23.1분기	○ 부지 잔금납부 및 소유권이전등기 ○ 기본 및 실시설계 ○ 공사 착공	
'23.2분기	○ 공사 준공 및 운영	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 공영주차장 운영 중

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

물소리공원 지하 공영주차장 건립

위 치 도



현장사진



4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역 준공																	
공사 착공 및 준공																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20.	○ 공모사업 선정(행정안전부)	
'21.	○ (일부 구간) 실시설계용역 준공	
'23.3	○ 사업대상지 확대(덕천시장 주변~덕천역 일원) ○ 추진계획 수립	
'23.4	○ 보행사업 추진기획단 및 주민협의체 구성	
'23.6	○ (확대 구간) 실시설계용역 시행(2023. 5. ~ 8.) ○ 공약사항 변경에 대한 공약자문단 자문의견 수렴	
'23.7	○ 보행사업 추진기획단 및 주민협의체 개최 ○ 부산시 설계자문 실시	
'23.9~10	○ 관계기관 협의	
'23.12	○ 실시설계 용역 준공 및 공사 착공	
'24.6~8.	○ 공사준공 및 교통안전 시설물 추가 설치	

6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

7. 향후 추진계획

- 시설물 관리 철저 및 추가사업 발굴 등

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
'23.7.27/10.5 주민협의체 회의		'23.8월 초 市 보행환경개선사업 설계자문		


공사구간 위치도 및 사업 전·후 사진

○ 위치도



사업 전

사업 후

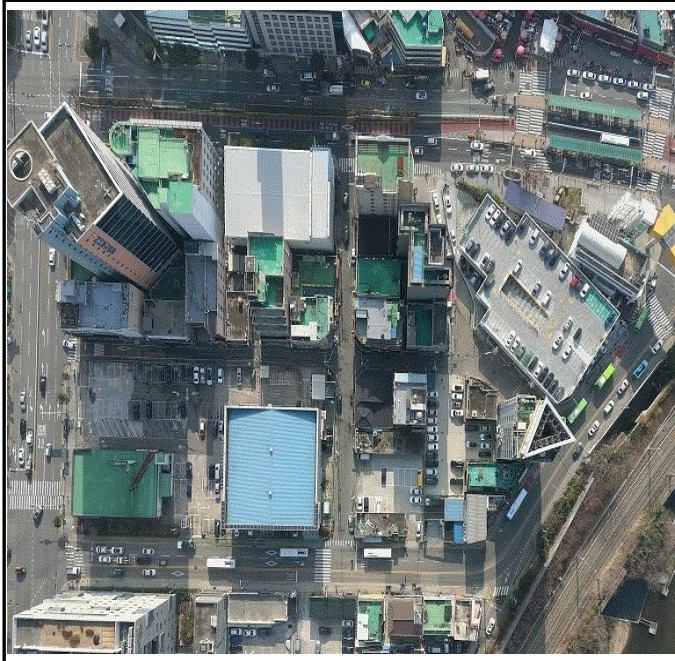


현장 사진




개선 전(좁은 보도폭, 노후 승강장)



개선 후(보도폭 확장 및 스마트승강장 설치)

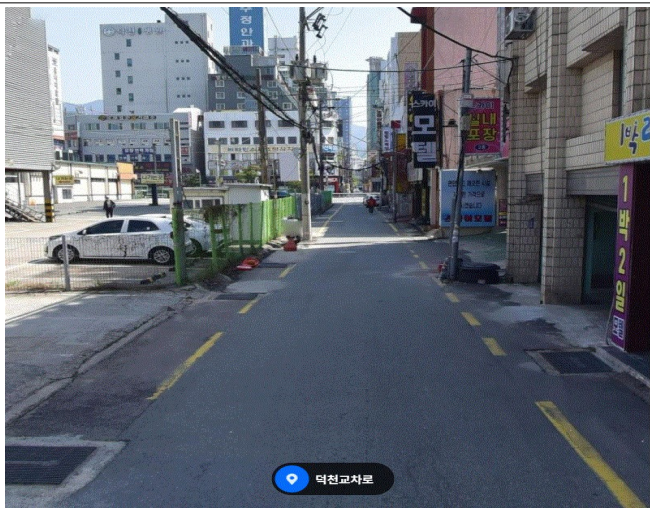

개선 전

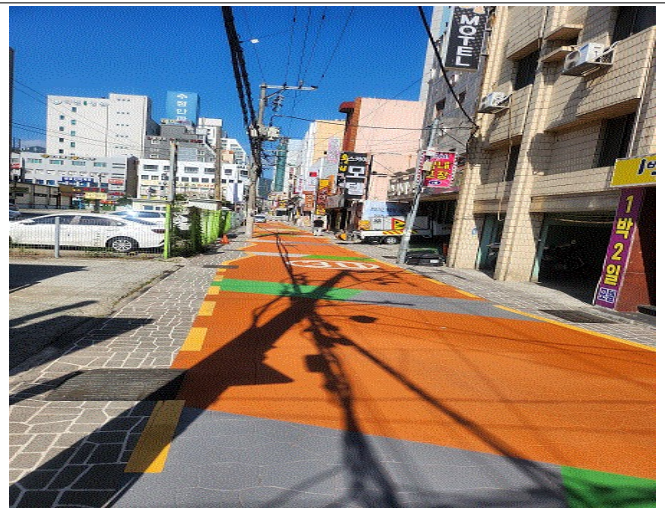

개선 후(패턴형 블록포장)



개선 전



개선 후(무단횡단방지 차선분리대 설치)

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
2차 공사 실시설계용역 준공																	
2차 공사 착공 및 준공																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'17	○ 산성로 위험도로 구조개선사업 추진계획 수립 ○ 1차, 2차, 3차 사전 심의 위원회 개최	
'19	○ 생태자연도 등급조정(1등급→2등급) 협의완료 ○ 도로구역결정고시 제2019-92호(10.16) ○ 분할측량(한국국토정보공사)	
'20	○ 토지 수용(보상협의 및 보상금 지급)	
'21	○ 1차 공사 착공 L=457m, B=6~8m	
'22	○ 1차 공사 준공 L=457m, B=6~8m ○ 문화재 현상변경 심의 ▶ 심의결과 : 불허 ○ 2차 공사 실시설계용역 ○ 2차 공사 착공	
'23~'24	○ 2차 공사 시행(L=1,943m) 및 준공(05.08.)	

6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

7. 향후 추진계획


- 위험도로 구조개선 사업 추가 발굴

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

공사구간 위치도

○ 위치도 : 화명동 산성로 산199-4번지 ~ 화명동 산7번지 일원

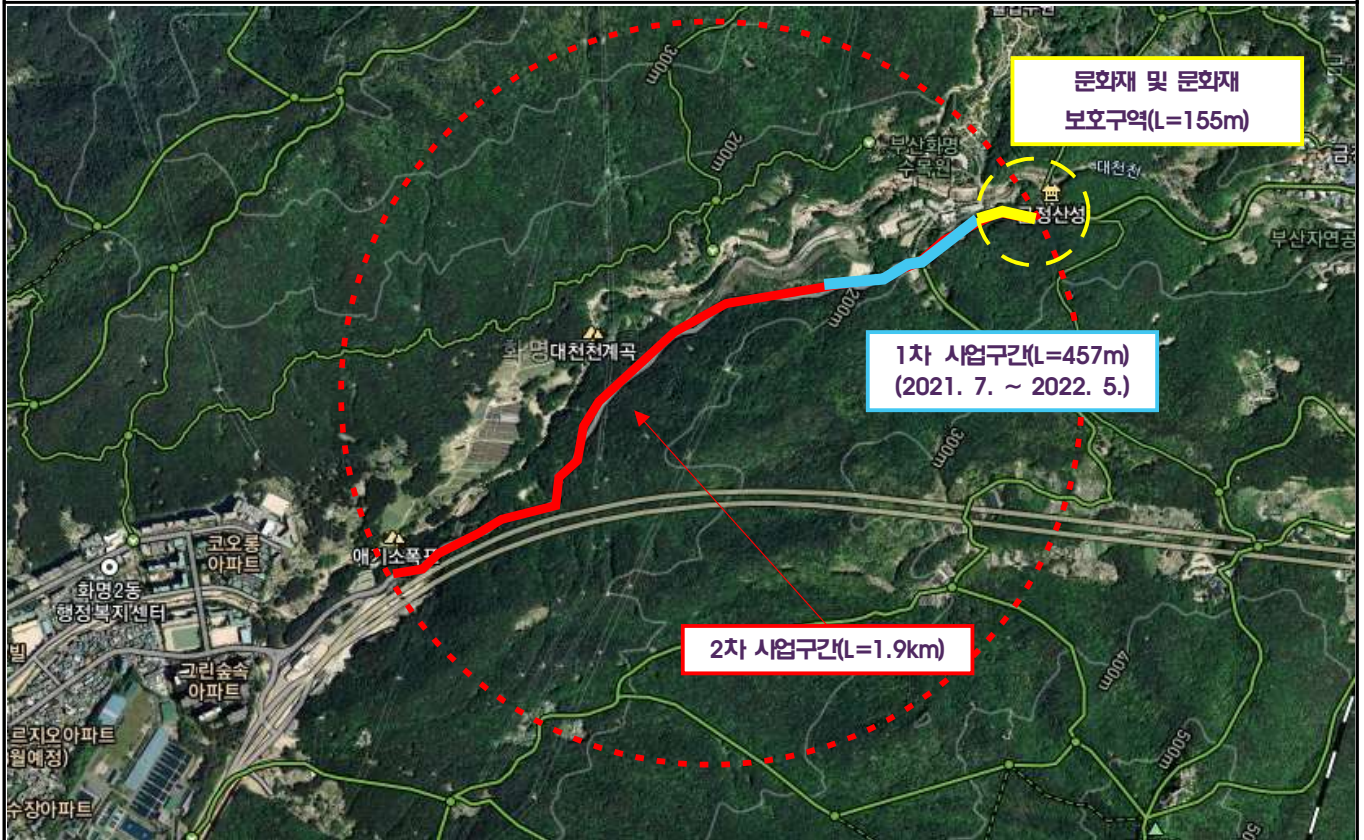

현장 사진



개선 전



개선 후(보도폭 확장 및 옹벽설치)



개선 전



개선 후(보도폭 확장 및 옹벽설치)



개선 전



개선 후(보도폭 확장 및 측구설치)

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24	비고
	3	4	1	2	3	4	1	
토지보상 관련 행정절차 이행								
공사 및 용역 추진								

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	○개발제한구역 주민지원사업 환경·문화사업 공모선정	
'21	○도시관리계획 결정 및 실시계획용역 발주 ○도시관리계획(시설; 공공공지)결정 및 지형도면고시	
'22	○도시계획시설(공공공지)사업 실시계획 고시 ○공사 착공	
'23	○보상 절차 이행 완료 ○공사 추진	
'24	○공사 완료	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 해당없음

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

위치도 및 현장사진(조감도)



1-10

구포1동 행정복지(복합)센터 건립

주관 부서	행정지원과지하행정팀 김문교(4114)	협조 부서	재무과 서정옥(4172)	공원녹지과 박아영(4532)	안전총괄과 김병호(4672) 서동진(4680)		건축과 유도균(5162)	작성기준 2026.3.31.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항					
임기내	계속	구	-					
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률			
2021년~2024년		7,551백만원	완료		100%			

1. 정책목표

- 구포1동 행정복지(복합)센터 건립으로 주민 편익 증진

2. 사업개요

- 추진기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업위치 : 북구 낙동대로1762번길 75(구포동 430-1)
- 사업규모 : 대지 998㎡, 연면적 1,689.46㎡(지하1층, 지상4층)
- 사업내용 : 행정복지센터, 생활문화센터, 다함께돌봄센터 등 복합센터 조성
- 소요예산 : 7,551백만원(특 1,200, 국 800, 시 310, 구 5,241)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'21	'22	'23	'24
			계	'22	'23	'24	'25	'26						
계	7,551	2,035.3	5,515.7	3,845.7	1,600	70	-	-	-	7,551	2,035.3	3,845.7	1,600	70
국비	800	375	425	375	-	50	-	-	-	800	375	375	-	50
시비	310	187.5	122.5	112.5	-	10	-	-	-	310	187.5	112.5	-	10
구비	5,241	272.8	4,968.2	3,358.2	1,600	10	-	-	-	5,241	272.8	3,358.2	1,600	10
기타 (특교세)	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	-	-	-

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
기본 및 실시설계 용역	■											
공사 착·준공			■				■					
인테리어 공사 등								■				

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市 건설기술심의, 계약심사 등 완료 ○ 기본 및 실시설계 용역 준공 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. 5. : 건축공사 착공 ※준공(예정): 2024. 10월 ○ 2023. 2. 20. : 주민설명회 개최 ☞주민 19명(공사안내 및 민원청취) ○ 2023. 3. 7. : 석면해체공사 및 지정폐기물처리 용역 완료 ○ 2023. 3. 17. : 구포동 430-1 도시계획선 분할측량 완료 ○ 2023. 4. 14. : 구포1동사 해체(철거)공사 준공 ○ 2023. 6. 9. : 공사 담당공무원 제1차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2023. 7. 27. : 공사 담당공무원 제2차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2023. 8. 1. : 구포1동행정복합센터 운영부서 간부회의 개최 ○ 2023. 8. 16. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서) ○ 2023. 8. 16. : 공사 담당공무원 제3차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2023. 9. 12. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서) ○ 2023. 11. 15. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서) 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 1. 23. : 공사 담당공무원 제4차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2024. 2. 14. : 인테리어공사 실시설계용역 발주 ○ 2024. 3. 26. : 공사 담당공무원 제5차 실무회의 개최 ☞예산검토 ○ 2024. 5. 10. : 인테리어공사 실시설계용역 완료 ○ 2024. 6. 7. : 인테리어공사 시공사 입찰·선정 ○ 2024. 7. 1. : 인테리어공사 착공 ○ 2024. 9. 13. : 인테리어공사 준공 ○ 2024. 10. 18. : 공사 준공(건축, 전기, 통신, 소방 등) ○ 2024. 10. 28. : 구포1동사 이전 및 업무개시 ○ 2024. 11. 7. : 신청사 개청식 개최 	

6. 관련사진 등

업무보고
구포동 행정복지센터 신축 공사 제4차 실무회의 결과보고

1. 회의 결과
2. 회의장면

업무보고
구포동 행정복지센터 신축 공사 제5차 실무회의 결과보고

1. 회의 결과
2. 회의장면

업무보고
구포1동 행정복지센터 인테리어 공사 설계용역 완료보고

1. 용역개요
2. 용역결과
3. 행정사항

업무보고
구포2동 행정복지센터 인테리어 공사 설계용역 완료보고

1. 용역개요
2. 용역결과
3. 행정사항

건립공사 제4차 실무회의 결과
(24. 1. 23.)

건립공사 제5차 실무회의 결과
(24. 3. 26.)

인테리어공사 설계용역 완료보고
(24. 5. 23.)

인테리어공사 (감리) 준공보고
(24. 9. 13.)

건립공사(건축) 준공검사 및 정산보고
(24. 11. 1.)



제5차 실무회의
(24. 3. 26.)

구청장 현장방문
(24. 4. 23.)

인테리어 공사 준공
(24. 9. 13.)

건립공사 준공검사
(24. 10. 23.)



최종 건립결과 및 개청 행사

주관 부서	미래전략과 전략사업팀	협조 부서		작성기준 2026.3.31.
	백승거(☎5422)			
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기후	신규	구	부산시, 문화체육관광부 : 사업비 지원, 관련사업 협력 추진 등	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2022 ~ 2032		-	정상추진	45%

1. 정책목표

- 「북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역」 수행
- 복합 트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보(국·시비, 민자 등)

2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2032년
- 사업위치 : 북구 전역
- 사업규모 : 별도 사업추진계획 수립을 통해 확정
- 사업내용 : 테마별 트래블로드 조성
 - 에코힐링로드, 어반컬쳐로드, 액티브트레킹로드
 - 트래블로드 25개 세부 관광콘텐츠 및 인프라 조성
- 소요예산 : 2023년 150백만원(별도 사업추진계획 수립을 통해 총 예산 확정)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	525				135	10	25	355		525		135	10	25	355
국비															
시비															
구비	525		225		135	10	25	355		525		135	10	25	355
기타 (민간)															

※ 별도 사업추진계획 수립을 통해 확정

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 정책연구용역 심의	■																
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 과업지시서 작성	■																
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역			■	■	■	■	■	■									
트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보, 사업추진(계속)								■	■	■	■	■	■	■	■		

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8월 ~ 9월 : 북구형 관광·힐링 시설 확대에 대한 설문조사 실시 ○ 11월 : 트래블 로드 조성 관련 콘텐츠 사례 벤치마킹 견학 실시 ○ 11월 : 「북구 복합 트래블 로드 조성 마스터플랜 수립 용역」 정책 연구용역 심의 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 입찰 공고 ※ 협상에 의한 계약 ○ 5월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 계약 체결 ○ 6월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 착수보고회 개최 ○ 6월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 거버넌스 회의 개최 ○ 11월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 벤치마킹 견학 ○ 11월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 중간보고회 개최 	
'24	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 기간 연장 ※ 기존) 23. 5. 25 ~ 24. 3. 19. ▶ 변경) 23. 5. 25 ~ 24. 5. 19. ○ 5월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 최종보고회 개최 및 준공 ○ 8월 : 북구 트래블 로드 해설집 제작 ○ 9월 : 북구 트래블 로드 관광굿즈 제작 ○ 10월 : 주민과 함께하는 노을구경 데이트 행사 실시 ○ 12월 : 트래블로드 홍보 영상 제작 	
'25	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1월 : 트래블로드 홍보 영상 유튜브 게시 ○ 2월 : 트래블로드 추진협의회 구성 및 운영 ○ 6월 : 제1회 북구 트래블로드 수국 축제 개최 및 달빛 야간관광길 걷기 행사 실시 ○ 9월 : 제12회 낙동강 구포나루축제 연꽃단지 야간관광길 조성 ○ 12월 : 트래블로드 추진협의회 회의 실시 	
'26	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1월~2월 : '장미공원, 빛의 소망길을 걷다-북구 트래블로드 주간 행사 운영 	

6. 문제점 및 대책 : 없음

7. 향후 추진계획

- 2026. 3. ~ 9. : 트래블로드 거점구간 디자인 경관 개선 사업 추진
- 2026. 6. : 수국과 함께하는 북구 트래블로드 주간 행사 추진

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
	1회	2회		3회

- 2022. 8. 22. ~ 9. 4. 북구형 관광·힐링 시설 확대에 대한 설문조사
- 2023. 8. 30. 북구 트래블 로드 마스터플랜 거버넌스 회의
- 2024. 10. 8. 주민과 함께하는 노을구경 데이트 행사
- 2025. 6. 21. ~ 28. 제1회 북구 트래블로드 수국 축제 개최
- 2025. 6. 28. 달빛 야간관광길 걷기 행사 실시
- 2025. 9. 26. ~ 28. 제12회 낙동강 구포나루축제 연꽃단지 야간관광길 조성
- 2026. 1. 26. ~ 2. 22. '장미공원 빛의 소망길을 걷다' -북구 트래블로드 주간 행사 운영

주관 부서	문화관광과 관광기획팀	협조 부서	시 낙동강관리본부	-	작성기준 2026.03.31.
	정미경(☎4524)		김승훈(☎310-6056)	-	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구	낙동강유역환경청 하천점용허가 부산광역시 낙동강관리본부 공원시설사용허가		
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률
2022. ~ 2026.		943백만원	완료 후 계속		100%

1. 정책목표

- 관광활성화 프로그램 운영(낙동강 감동포구 생태여행, 웰니스 생태여행 등)

2. 사업개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 화명생태공원 일원 및 연계 생태관광지
- 사업규모 : 생태관광 상설·특별프로그램 운영 및 관광인프라 확충 등
- 사업내용
 - 관광활성화 프로그램 운영 : 낙동강 감동포구 생태여행, 웰니스 생태여행 등
 - 관광시설 개선 : 관광안내소 및 포토존 조성, 생태관광 거점 조성 등
- 소요예산 : 943백만원

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	932	-	932	220	232	232	80	168	-	943	231	232	232	80	168
국비	426	-	426	110	116	116	-	84	-	431	115	116	116	-	84
시비	213	-	213	55	58	58	-	42	-	216	58	58	58	-	42
구비	293	-	293	55	58	58	80	42	-	296	58	58	58	80	42
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
관광안내소 설치	■	■															
포토존 조성	■	■															
이음피크닉 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
낙동강 감동포구 생태여행	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
웰니스 생태여행											■	■	■	■	■		

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22. 5. ~ 10. : 북구 이음 피크닉 ○ '22. 7. ~ 11. : 낙동강 감동포구 생태여행 상설·특별 프로그램 운영 ○ '22. 10. : 북구 관광안내소 설치 ○ '22. 12. : 낙동 아트리버 코딩 작품 전시회 개최 ○ '22. 12. : 「감동진 문화포구」 포토존 조성 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23. 2. : 2023년 낙동강 감동포구 생태여행 기본계획 수립 ○ '23. 2. : 공약사항 변경(카약계류장 조성사업 폐기) ○ '23. 3. : 화명생태공원 생태관광안내판 설치 ○ '23. 5~ 12. : 생태체험 상설·특별프로그램 운영 ○ '23. 6. : 전통재현 밀수확 체험 행사 실시(참가인원: 200명) ○ '23. 5. ~ 8. : 생태(문화)관광해설사 양성과정 운영 및 신규 위촉(9명) ○ '23. 12. : 겨울 철새 탐조여행(참가인원 : 38명) 	
'24	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24. 1. : 2024년 낙동강 감동포구 생태여행 기본계획 수립 ○ '24. 2. ~ 3. : 북새통이 포토존, XR 망원경, 관광안내키오스크 설치 ○ '24. 4. ~ 12. : 생태체험 상설·특별 프로그램 운영 ○ '24. 6. : 낙동강 생태체험 한마당 행사 실시(참가인원: 2,000여명) ○ '24. 8. : 여름밤 감동생태나들이(부산관광공사 협업, 180여명) ○ '24. 11. ~ 12. : 겨울 철새 탐조여행(참가인원 : 136명) ○ '24. 12. ~ '25. 2. : 감동나룻길 리버워크 일원 힐링 쉼터 조성 	
'25	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25. 2. : 2025년 굿포 웰니스 생태여행 기본계획 수립 ○ '25. 3. : 생태여행 홈페이지 제작, 도심 속 생태나들이 운영 계획 수립 ○ '25. 4. ~ 6. : 도심 속 생태나들이 운영(참가인원: 911여명) ○ '25. 6. : 웰니스 생태여행 '자연, 마주보다' 추진(참가인원: 1,000명) ○ '25. 9. ~ 12. : 철새따라 탐조여행 운영(참가인원: 859여명) 	
'26	<ul style="list-style-type: none"> ○ '26. 2. : 2026. 웰니스 생태여행 기본계획 수립 ○ '26. 3. : 2026. 웰니스 생태여행 운영 용역 계약 등 추진 	

6. 문제점 및 대책 : 해당없음

7. 향후 추진계획

- 관광 트렌드인 웰니스 특성화를 통해 서부산 생태관광 중점 브랜드화

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	6	-	6	-

5. 추진현황

연도	추진내용	비고
2015	○2월 : 투자의향서 제출(사업자 → 시)	
2019	○12월 : 산업단지계획심의위원회 자문회의 가결 (주거용지 비율 축소 37.8% → 27.8%)	
2020	○3월 : 산업단지계획 승인 고시(부산광역시 고시 제2020-97호) ○12월 : 조달청 부지 매입계약 체결(527.8억원)	
2021	○금곡도시첨단산업단지 조성사업 기공식(11. 24.)	
2022	○1월 : 산업단지계획 변경 승인 고시(부산광역시 고시 제2022-1호) ○10월 : 산업단지 관리기본계획 고시 (부산광역시 고시 제2022-408호)	
2023	○12월 : 산업단지계획 변경 승인 고시(부산광역시 고시 제2023-476호)	
2025	○8월 : 산업단지계획 변경 승인 고시(부산광역시 고시 제2025-330호)	대표자변경
	○12월 : 산업단지계획 변경 승인 고시(부산광역시 고시 제2025-474호)	개발기간 연장 (~26.12.31.)
2026	○1월 : 산업단지계획(변경) 승인 신청에 대한 관련 부서 의견 협의 ○2월 : 산업단지계획(변경) 위한 주민합동설명회 개최	

6. 문제점 및 대책

- 경기 불황으로 시공사 선정 등의 어려움이 있어 단지 착공 및 준공 지연

7. 향후 추진계획

- 2026. 8월 : 산업단지계획 변경 고시 승인 예정
- 입주기업 유치를 위한 획지 분할 및 도로 개설 등
- 2026. 12월 : 금곡도시첨단산업단지 준공(예정)

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
주민합동설명회 (26.2.)	-	산업단지계획심의위원회(19.2.)	-	-

주관 부서	일자리경제과 동물친화팀	협조 부서	공원녹지과 공원팀	안전총괄과 기전관리팀	작성기준
	황태원(☎4652)				2026.3.31.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	신규,계속	구			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022~2026		2,213백만원	정상추진	95%	

1. 정책목표

- 반려동물 양육인 증가에 따른 편의 인프라 지원으로 반려동물 친화도시 조성
- 관내 반려동물 관련 산업 육성으로 일자리 창출

2. 사업개요

- 도심갈매길 조성사업(반려동물 친화거리)
 - ▷ 사업위치 : 구포시장, 화명 기차길 숲속 산책로 일원
 - ▷ 사업기간 : 2023년 ~ 2024년 ※ 2024. 12. 18. 공사준공
 - ▷ 사업내용 : 도심내 반려동물과 걷기좋은 보행길 조성 및 경관 개선
 - 구포시장 공공공지 화단 조성, 구포시장 동문 방향 일방통행로 스텐실 포장, 구포시장 나루쉼터 및 상설무대 리모델링, 금빛노을브릿지 미디어아트 조성, 화명기차길숲속산책길 보행로 신설 등
 - ▷ 소요예산 : 2,133백만원(시 1,600백만원, 구 533백만원)
- 「반려동물산업 지원 플래닛」 입주자 모집·선정
 - ▷ 사업위치 : 구포시장공영주차장 부설 상가(112호)
 - ▷ 모집사유 : 기존 입주업체의 사용허가 취소('26. 2. 20.자)로 반려동물 산업 지원을 위한 새로운 업체 모집 필요
 - ▷ 사업내용 : 반려동물 산업 홍보, 반려동물 아카데미 개최, 주민 회의공간 활용, 반려동물 용품 판매(영업자) 등
 - ▷ 사용허가 기간 : 2026. 4. 1. ~ 2028. 3. 31.(2년간)

○ 동물사랑 문화축제 개최

- ▷ 사업기간 : 2022 ~ 2025 (연 1회) ※ 2025년 미개최 : 사업예산 미반영
- ▷ 사업내용 : 건전한 반려동물 양육 문화 조성을 위한 문화·체험행사 개최
- ▷ 소요예산 : 80백만원(구비)

3. 연도별 소요 예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	2,263	-	2,263	50	180	2,033	-	-	-	2,213	284	1,929	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,600	-	1,600	-	150	1,450	-	-	-	1,600	234	1,366	-	-	-
구비	663	-	663	50	30	583	-	-	-	613	50	563	-	-	-

4. 추진계획

○ 반려동물 친화거리 조성

추진사항	2022		2023			2024				2025				2026		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2
사업대상지 발굴 및 사업공모	■	■	■	■													
설계 용역 및 공사 추진				■	■	■	■	■	■	■							

○ 반려동물산업 지원 플래닛 조성

추진사항	2022		2023			2024				2025				2026		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2
반려동물산업 지원 플래닛 입주업체 선정(1개소)	■	■									■				■		
플래닛 운영·관리				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

○ 동물사랑 문화축제 개최

추진사항	2022		2023			2024				2025				2026		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2
축제 준비 및 홍보	■		■	■			■	■			■	■					
축제 개최		■			■				■					■			

※ 2025년 축제 미개최 : 사업예산 미반영

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물산업 지원 플래닛 입주기업 공모(2022.12.21.~2023.1.6.) ○제3회 부산 북구 동물사랑 문화축제 개최(2022.11.12., 화명생태공원) 	
2023년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 변경 신청(3.7.) ○반려동물산업 지원 플래닛 입주기업 선정 및 사용허가(2.2.) 	
2023년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷기본 및 실시설계 용역 추진계획 수립(4.24.) ▷1차 입찰공고(5.2.~5.23.), 2차 입찰공고(5.26.~6.8.) ▷제안서 평가위원회 구성 및 개최(6.27.) ○반려동물산업 지원 플래닛 개소(5.22.) <ul style="list-style-type: none"> ▷반려동물 아카데미 1차 운영(6.13.~6.14.) 	
2023년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성 기본 및 실시설계 용역 착수(7.20.) <ul style="list-style-type: none"> ▷용역 착수 보고회 개최(8.8.) ○반려동물산업 지원 플래닛 아카데미 개최 및 브랜드숍 물품 전시 <ul style="list-style-type: none"> ▷반려동물 아카데미 2차 운영(9.19.~9.20.) ▷브랜드숍 물품 전시(9.19.) <ul style="list-style-type: none"> - 북구 사회적기업 2개 업체 : (주)앤즈글로벌, (주)맘씨생활건강 - 애견용품 11종 전시(간식 6종, 패드 1종, 비누 4종) 	
2023년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성 기본 및 실시설계 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷용역 중간 보고회 개최(12.6.) ▷화명3동 주민설명회 개최(12.13.) ○제4회 부산 북구 동물사랑 문화축제 개최(2023.10.28., 화명생태공원) 	
2024년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷북구 경관위원회 심의(1.15.) ▷용역 최종 보고회 개최(2.21.) ▷용역 준공(3.20.) 	
2024년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷반려동물 친화거리 조성 공사 및 폐기물처리 용역 계획 수립(4.8.) ▷금빛노을브릿지 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작 계획 수립(5.13.) ▷반려동물 친화거리 조성 공사 및 폐기물처리 용역 착공(6.3.) ▷금빛노을브릿지 미디어아트 용역 제안서 평가위원회 개최(6.14.) ▷금빛노을브릿지 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작 용역 착수(6.28.) ○반려동물산업 지원 플래닛 아카데미 개최(2회, 5.22./5.29.) 	
2024년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○반려동물 친화거리 조성사업 공사 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷반려동물 친화거리 조성 공사 및 폐기물처리 용역(6.3.~) ▷반려동물 친화거리 조성 사업 전기공사 착공(6.19.~) ▷금빛노을브릿지 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작 용역 추진(6.28.~) 	

<p>2024년 4분기</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부산 북구 동물사랑 문화축제 개최(2024.10.5.~10. 6.) 화명생태공원 - 부산광역시 농축산유통과 주관 시행 ○ 반려동물 친화거리 조성사업 공사 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 금빛노을브릿지 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작 용역 준공(10.22.) ▷ 반려동물 친화거리 조성 사업 전기공사 준공(10.30.) ▷ 반려동물 친화거리 조성사업 폐기물처리 용역 준공(10.30.) ▷ 반려동물 친화거리 조성 공사 준공(11.29.) 	
<p>2025년 1분기</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「반려동물산업 지원 플래닛」 새 입주기업 모집 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 모집기간 : 2025. 2. 19. ~ 2025. 3. 7. ▷ 신청자격 : 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 청년기업 등 ▷ 허가조건 : 반려동물 관련 업종 	
<p>2025년 2분기</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「반려동물산업 지원 플래닛」 새 입주기업 선정 및 사용허가(5.15.) <ul style="list-style-type: none"> ▷ 선정업체 : (주)엔즈글로벌 - 펫푸드 제조업(사회적기업) ▷ 사용허가 : 2025. 5. 15. ※ 2026. 2. 20. 사용허가 취소(종료) 	
<p>2026년 1분기</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「반려동물산업 지원 플래닛」 입주자 모집 및 선정 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 모집기간 : 2026. 2. 25. ~ 3. 5. ▷ 모집방법 : 공개입찰(온비드) ▷ 모집내용 : 공유재산(상가) 및 반려동물산업 지원플래닛 운영자 모집 ▷ 입찰결과 : 운영자 1명 낙찰(3. 6.) ▷ 사용기간 : 2026. 4. 1.~ 2028. 3. 31.(2년간) ▷ 향후계획 : 카페(애견동반) 및 반려동물산업 지원플래닛 연계 운영 	

6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

7. 향후 추진계획

- 반려동물 친화거리(도심갈맷길) 관리
- 반려동물산업 지원 플래닛 운영
- 올바른 반려동물 양육 문화 및 생명 존중 인식 개선 홍보 등

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	2	4	4	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정이있는 구포시장 3차 아케이드 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 낙동대로1776번길(구포동) 일원 - 기간 : 2021. 12. 7. ~ 2022. 8. 20. - 소요예산 : 466,012천원(시비^{75%} 349,510 구비^{15%} 69,901, 자부담^{10%} 46,601) - 내용 : 3차 아케이드 시설물 정비 ▶ 건축, 전기, 소방(기계/전기) 	전통시장 시설 현대화 사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만덕시장 정밀안전진단 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 만덕1로24번길 8(만덕동) - 기간 : 2022. 8. 18. ~ 10. 14. - 소요예산 : 19,780천원(시비^{60%} 11,686, 구비^{40%} 7,912) 	전통시장 소규모 환경개선 사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕천시장 어닝 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 만덕대로78번길 22(덕천동) - 기간 : 2022. 9. 16. - 소요예산 : 12,826천원(시비^{60%} 7,696, 구비^{40%} 5,130) - 내용 : 비가림 및 차양 목적 전동 어닝 4식 설치 	전통시장 소규모 환경개선 사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만덕시장 보수공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 만덕1로24번길 8(만덕동) - 기간 : 2022. 11. 16 ~ 12. 1. - 소요예산 : 16,413천원(시비^{60%} 9,848, 구비^{40%} 6,565) - 내용 : 벽체 배수관·방수관 설치, 철근 노출 피복 보수 등 	전통시장 소규모 환경개선 사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만덕제일상가시장 계량기 보관함 덮개 교체 등 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 은행나무로 12-1 (만덕동) - 기간 : 2022. 10. 11 - 소요예산 : 4,055천원(구비) - 내용 : 계량기 등 보관함 2개 교체, 미끄럼방지 포장 2개소 	전통시장 노후 시설물 정비
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정이있는 구포시장 나루카페 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 구포동 160-3번지 - 기간 : 2022. 11. 23. ~ 12. 5. - 소요예산 : 12,275천원(구비) - 내용 : 목재 계단 교체, 데크 수리 및 오일스테인 작업 등 	전통시장 노후 시설물 정비
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕천시장 통행로 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 만덕대로78번길 22(덕천동) - 기간 : 2022. 12. 1. ~ 12. 8. - 소요예산 : 3,239천원(구비) - 내용 : 덕천시장 연결 통행로 보수 및 도색 등 	전통시장 노후 시설물 정비
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정이있는 구포시장 2차 아케이드 개폐장치 수리 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 구포동 148번지 일원 - 기간 : 2022. 12. 23. ~ 12. 27. - 소요예산 : 4,900천원(구비) - 내용 : 아케이드 지붕 자동 개폐장치 모터 및 체인 수리 등 	전통시장 노후 시설물 정비

'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정이있는 구포시장 2차 아케이드 지붕 개폐장치 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2023. 4. 19. ~ 4. 25. - 내 용 : 모터(1·2호기) 및 체인보수, 컨트롤 패널 보수 등 - 소요예산 : 7,832천원(구비) 	전통시장 노후 시설물 유지보수
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만덕시장·만덕제일상가시장 CCTV 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2023. 6. 7. ~ 6. 21. - 내 용 : 만덕시장 CCTV 7대, 만덕제일상가시장 CCTV 14대 설치 - 소요예산 : 20,000천원(시비^{60%} 12,000 구비^{40%} 8,000) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 만덕시장 5,300천원, 만덕제일상가시장 14,700천원 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정이있는 구포시장 화재알림시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2023. 6. 29.~ 12. 19. - 내 용 : 정이있는 구포시장 개별점포 293개소 화재알림시설 설치 - 소요예산 : 190,637천원(국비^{70%} 133,446 시비^{15%} 28,595 구비^{15%} 28,595) 	전통시장 및 상점가 활성화 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕천시장 보수공사 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2023. 7. 21. ~ 8. 14. - 내 용 : 소규모 취약시설 안전점검 결과에 따른 보수·보강 공사 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 벽체 균열보수, 콘크리트 단면복구, 방청도장 등 - 소요예산 : 18,900천원(시비^{80%} 15,120 구비^{20%} 3,780) 	전통시장 재난·재해 예방 및 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕천시장 방송시설 설치 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2023. 8. 16. ~ 8. 25. - 사업내용 : 시장 내 방송시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 앰프시스템 1.스피커 27대 설치, 배관배선설비 등 - 소요예산 : 19,100천원(시비^{60%} 11,460 구비^{40%} 7,640) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정이있는 구포시장 3차 아케이드 기둥 등 보강공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : (1차) 2023. 8. 3.~ 8. 9. (2차) 2023. 8. 7.~ 8. 11. - 내 용 : 기둥 하부 보강 및 기둥 도색 등 - 소요예산 : 6,980천원(구비) 	전통시장 노후 시설물 유지보수
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕천시장 화장실 개·보수 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2023. 10. 5.~ 10. 31. - 내 용 : 공용 화장실 개·보수(철거, 타일·천장, 도기류 설치 등) - 소요예산 : 21,300천원(시비^{60%} 12,780 구비^{40%} 8,520) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만덕제일상가시장 지붕 천막 수리(교체) <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2023. 10. 10. , 1일간 - 내 용 : 만덕제일상가시장 찢어진 지붕 천막(13㎡) 교체 - 소요예산 : 1,210천원(구비) 	전통시장 노후 시설물 유지보수
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정이있는 구포시장 문화공연장 등 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2023. 10. 16.~ 10. 18. - 내 용 : 문화공연장 및 나루카페 보수 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 문화공연장: 부식된 내부 파이프 교체, 기둥 미장 3개소, 타일 11개소(수평작업) ▶ 나루카페: 상부 방부목 교체 3㎡, 출입구 바닥 미장, 측면 흔들림 고정 - 소요예산 : 3,978천원(구비) 	전통시장 노후 시설물 유지보수
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕천시장 후면복도 정밀안전점검 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2023. 12. 5. ~ 12. 21. - 내 용 : 건축물의 안정성 및 손상상태 점검, 보수·보강방법 제시 등 - 소요예산 : 7,700천원(시비^{80%} 6,160 구비^{20%} 1,540) 	전통시장 재난·재해 예방 및 지원사업

'24	<p>○ 구포축산물도매시장 노후전선정비</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 6. 7. ~ 2025. 2. 19. - 내 용 : 분전반·차단기 교체, 배선 공사, 배선 기구 교체 등 - 소요예산 : 200,000천원(국비 100,000^{50%} 시비^{20%} 40,000 구비^{20%} 40,000 민간·한전^{10%} 20,000) 	전통시장 활성화 지원사업
	<p>○ 정이있는 구포시장 무인정산기·cctv 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 1. 8. ~ 4. 4. - 내 용 : 무인정산기 2대, cctv 5대 설치 - 소요예산 : 39,764천원(국비 23,858^{60%} 시비^{20%} 7,953 구비^{20%} 7,953) 	전통시장 주차환경 개선사업
	<p>○ 구포축산물도매시장 지하매설식 소화전함 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 3. 14. ~ 9. 20. - 내 용 : 지하매설식 소화전함 설치 5곳 - 소요예산 : 81,432천원(시비^{80%} 65,145, 구비^{20%} 16,286) 	전통시장 시설현대 화사업
	<p>○ 덕천시장 지붕 판넬 및 우수관 보수 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 11. 21. ~ 12. 11. - 사업내용 : 우수관로 보수 및 지붕 판넬 교체 등 - 소요예산 : 19,300천원(시비^{75%} 14,475, 구비^{15%} 2,895, 민간^{10%} 1,930) 	전통시장 시설현대 화사업
	<p>○ 정이있는 구포시장 아케이드 소방시설 보완</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 11. 27. ~ 2025. 8. 4. - 사업내용 : 아케이드 스프링클러 교체(습식→준비작동식) - 소요예산 : 79,442천원(시비^{80%} 63,553, 구비^{20%} 15,888) 	전통시장 시설현대 화사업
	<p>○ 덕천시장 후면복도 보수·보강 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 5. 7. ~ 5. 21. - 내 용 : 건물 단면복구 전처리, 녹색거형 방청, 콘크리트 표면 퍼티 도장 등 - 소요예산 : 16,280천원(시비^{60%} 9,768 구비^{40%} 6,512) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<p>○ 구포축산물도매시장 아케이드 보수 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 6. 25. ~ 8. 2. - 내 용 : 아케이드 우수관로 등 보수 - 소요예산 : 18,120천원(시비^{60%} 10,872 구비^{40%} 7,248) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<p>○ 만덕시장 정밀안전진단 보수·보강 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 7. 1. ~ 7. 28. - 내 용 : 철근노출 단면복구, 조적면 단면 복구, 외벽 균열 보수 등 - 소요예산 : 18,600천원(시비^{60%} 11,160 구비^{40%} 7,440) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<p>○ 만덕시장 화장실 벽타일 교체 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 7. 3. ~ 7. 17. - 내 용 : 화장실 벽타일 교체 및 천장유도 배수 작업 - 소요예산 : 3,720천원(시비^{60%} 2,232 구비^{40%} 1,488) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<p>○ 덕천시장 소방시설 설비 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 11. 1. ~ 12. 9. - 사업내용 : 화재감지기 신규설치 및 노후·불량감지기 교체 - 소요예산 : 21,742천원(시비^{60%} 13,045, 구비^{40%} 8,697) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구포시장 아케이드 보수 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 10. 28. ~ 11. 25. - 사업내용 : 4차 아케이드 우수관로 보수 및 도장 등 - 소요예산 : 21,291천원(시비^{60%} 12,775, 구비^{40%} 8,516) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만덕 제일상가시장 간판 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024. 12. 3. ~ 2024. 12. 28. - 사업내용 : 전통시장의 입구 3개소 간판 설치 - 소요예산 : 7,315천원(시비^{60%} 4,389, 구비^{40%} 2,926) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 노후시설물 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2024년 연중 - 사업내용 : 구포시장 아케이드 보수, 인입전선 교체 등 5회 - 소요예산 : 20,000천원(구비) 	전통시장 노후시설물 보수
'25	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구포축산물도매시장 첫걸음기반조성 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2025. 3월 ~ 2025. 12월 - 내 용 : 마케팅 지원 및 환경개선 등 전통시장 현대화를 위한 기반조성 - 소요예산 : 240,000천원(국비 144,000^{60%}시비^{20%} 48,000 구비^{20%} 48,000) 	전통시장 활성화 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구포시장 7차 아케이드 배수관 보수 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2025. 5. 27. ~ 6. 24. - 사업내용 : 7차 아케이드 배수관 바닥 녹제거 및 도색 등 - 소요예산 : 14,850천원(시비^{60%} 8,910, 구비^{40%} 5,940) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕천시장 외부복도 및 난간 보수 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2025. 6. 9. ~ 7. 11. - 사업내용 : 외부복도 바닥 미장 및 균열 보수, 난간 추가설치 등 - 소요예산 : 12,100천원(시비^{60%} 7,260, 구비^{40%} 4,840) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화명동원시장 공용화장실 환경개선 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2025. 5. 30. ~ 2025. 12. 22. - 사업내용 : 저지대 공용화장실 풍수해 피해예방, 위생개선 등 - 소요예산 : 39,398천원(시비^{60%} 23,639, 구비^{40%} 15,759) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕천시장 상가 천장 크랙 보수 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2025. 9. 8. ~ 2025. 10. 15. - 사업내용 : 천장박리 및 천장틀 제거, 노출 철근 방청처리 등 - 소요예산 : 19,690천원(시비^{60%} 11,814, 구비^{40%} 7,876) 	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정이있는 구포시장 7차 아케이드 개폐장치 수리 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2025. 9. 9. ~ 9. 19. - 사업내용 : 기존 제품 (모터 1개,체인기어 24m,롤러 3개 등) 철거·교체 설치 - 소요예산 : 4,700천원(구비) 	전통시장 노후시설물 보수
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정이있는 구포시장 아케이드 LED 등 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2025. 11. 27. ~ 2025. 12. 17. - 사업내용 : 기존 전등 LED 램프 (120w)으로 교체 - 소요예산 : 13,300천원(구비) 	전통시장 노후시설물 보수
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구포축산물시장 내 도로 도막 포장 <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2025. 12. 2. ~ 12. 17. - 사업내용 : 시장 내 도로 도막 포장 - 소요예산 : 53,499천원(시비^{80%} 42,799, 구비^{20%} 10,699) 	전통시장 시설현대화 사업

'26	○ 정이있는 구포시장 10차 아케이드 설치 - 추진기간 : 2026. 1. ~ 추진중 - 사업내용 : 아케이드 신규 설치 ▶ 고객편의시설 앞 70㎡ - 소요예산 : 300,000천원(특별교부세 300,000)	전통시장 시설현대화 사업
	○ 정이있는 구포시장 아케이드(7·8·9차) 소방시설 교체 - 추진기간 : 2026. 1. ~ 추진중 - 사업내용 : 아케이드 스프링클러 교체(습식 → 준비작동식) - 소요예산 : 99,117천원(시비 ^{80%} 79,293, 구비 ^{20%} 19,824)	전통시장 시설현대화 사업

6. 문제점 및 대책

- 관리주체가 없는 소규모 무등록 시장은 각종 지원사업에서 소외
 - ▷ 자력으로 사업신청이 어려운 무등록 시장 방문 안내 및 신청지원
 - ※ 화명동원시장 상권 활성화 주민설명회 개최 ('23년 9월, 21명 참여)

7. 향후 추진계획

- 전통시장 노후 시설물 유지 보수
 - 추진기간 : 2026년 1월 ~ 12월
 - 사업위치 : 관내 전통시장
 - 사업내용 : 전통시장 노후시설물 긴급 보수·보강 등 수시 정비
 - 소요예산 : 20,000천원(구비)
- 정이있는 구포시장 증발냉방장치 설치
 - 추진기간 : 2026년 4월 ~ 2026년 8월
 - 사업위치 : 정이있는 구포시장
 - 사업내용 : 1차 아케이드 구간(200m) 내 증발냉방장치 설치
 - 소요예산 : 400,000천원(특별조정교부금)
- 정이있는 구포시장 바닥환경개선 사업
 - 추진기간 : 2026년 8월 ~ 11월
 - 사업위치 : 정이있는 구포시장 바닥 노면 등
 - 사업내용 : 노면에 찾아가기 쉬운 방향 표시 도색 작업 등
 - 소요예산 : 100,000천원(시비)

8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문	언론·방송보도	기타
화명동원시장 상권 활성화 주민설명회 개최 ('23년 9월, 21명 참여)				

주관 부서	도시창조과 도시공간기획팀		협조 부서	건설과 토목팀		작성기준 2026.3.31.
	백상의, 김진이(☎4405)			박재우(☎4692)		
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	계속	보조사업				
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률		
2018 ~ 2024		34,788백만원	완료	100%		

1. 정책목표

- 구포역세권 상권 활성화 및 지역 공동체 회복
- 거점 시설 이음을 통해 생태·문화분야 서부산관광 중심지 도약

2. 사업개요

- 추진기간 : 2018 ~ 2024
- 사업위치 : 부산 북구 구포동, 구포역세권 및 구포시장 일원
- 사업규모 : 244,000m²
- 사업내용 : 9개 세부사업

기능이음 사업(111.5억)	장소이음 사업(217.3억)	사람이음 사업(19억)
구포 청년센터 감동(46.7억)	구포역 광장 활성화 사업(10.4억)	구포 시간여행 사업(1.8억)
구포 밀당프로젝트(17.8억)	감동나루길 리버워크 조성(168억)	주민역량강화 사업(15억)
게스트하우스 조성(47억)	구포시장 가는 길 조성(38.9억)	살고 싶은 주거지 조성(2.2억)

- 소요예산 : 34,788백만원 (국 15,000, 시 7,500, 구 8,988, 특800, 교 2,500)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	35,006	23,798	11,208	3,456	7,752					11,208	3,456	7,752			
국비	15,000	14,050	950	950						950	950				
시비	7,500	2,748	4,752	2,000	2,752					4,752	2,000	2,752			
구비	9,206	6,200	3,006	506	2,500					3,006	506	2,500			
특교세	800	800													
특교금	2,500		2,500		2,500					2,500		2,500			

※ 기투자(구비) : 구포이음 활성화계획 수립(구 218,500천원, 2017년 지출) 포함

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
감동나룻길 리버워크 공사	■																
감동나룻길 리버워크 개통											■						
게스트하우스 공사	■																
게스트하우스 운영											■						

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'17	○ 국토부 도시재생 뉴딜 시범사업 공모 선정(중심시가지형)	
'19	○ 「부산 국제 수제맥주 마스터스 챌린지」 개최	
'20	○ 「구포국수체험관」 리모델링 공사 준공 ○ 「문화예술플랫폼」 리모델링 공사 준공	
'21	○ 「구포국수체험관」 재개관, 「청년센터 감동」 개소 ○ 1060DISH 청년식당 개소(단연, 미미요거트)	
'22	○ 밀당 창업점포 2호점(제과점빵), 3호점(프린체) 개소	
'23	○ 1060DISH 청년식당 2기 개소(지금, 여기) ○ 게스트하우스 준공 ○ 게스트하우스 및 양조체험장, 밀당브로이 등 운영자 선정	
'24	○ 구포이음 거점시설 운영자 업무 간담회 개최 ○ 감동나룻길 리버워크 운영계획 수립 ○ 감동나룻길 리버워크 공사 준공 및 개통 ○ 게스트하우스 운영자 선정	

6. 문제점 및 대책

- 2024년 도시재생 사업 준공 이후 안정적 거점 시설 등 운영
 - ▷ 구포이음 도시재생 거점시설 운영자 등 협의체 구성 등 네트워크 운영 지원

7. 향후 추진계획

- 감동나룻길 리버워크 안전관리 등 운영 철저
- 게스트하우스 개소 위탁 운영 지원 등

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
사업 설명회 등 12회	연 1회	사업추진협의회 개최	kmn 등 150회	

주관 부서	도시창조과 도시공간기획팀	협조 부서	공원녹지와 공원팀	교통행정과 교통사업팀	작성기준
	강현미(☎4405)		정혜인(☎2052)	이시윤(☎4502)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기후	계속	국책, 시, 구			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2021 ~ 2026		22,359백만원	정상추진	81%	

1. 정책목표

- 덕천동 도시재생활성화계획 의거한 원활한 사업 추진 및 완료
 - ▷ 숙등 공유어울림파크 조성사업, 재능공유 청춘길 조성사업, 숙등 공동체 역량강화 등

2. 사업개요

- 추진기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업명 : 공유바람, 숙등(淑磴)을 채우다
- 사업위치 : 부산 북구 덕천동 410-4번지 숙등공원 일원 ▶ 덕천1.3동
- 사업규모 : 203,900㎡
- 사업내용 : 노후주거지 생활인프라 정비 및 골목상권 활성화

주거활력 공유사업(200.00억)	골목상권 공생사업(8.92억)	공동체 공존사업(14.67억)
숙등 공유어울림파크 조성(198.98억)	재능공유 청춘길 조성(7.2억)	골목 공유마당 케어사업(0.5억)
누구나 생활서비스 운영(1.02억)	덕천시장 청춘먹거리 운영(1.72억)	숙등 상생협의체 점포공생사업(0.35억)
		숙등 공동체 역량 강화(11.92억)
		숙등 마을관리협동조합 육성(1.9억)

- 소요예산 : 22,359백만원(국 9,310 시 4,655 구 7,394 기 1,000)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	22,359	1,622	20,737	1,867	3,133	5,719	7,331	2,687		19,158	1,867	3,133	5,719	7,331	1,108
국비	9,310	1,500	7,810	1,300	1,000	3,720	1,790	0		7,810	1,300	1,000	3,720	1,790	0
시비	4,655	0	4,655	200	200	1,880	2,375	0		4,655	200	200	1,880	2,375	0
구비	7,394	122	7,272	367	1,933	119	3,166	1,687		5,693	367	1,933	119	3,166	108
기타(민간)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000		1,000	0	0	0	0	1,000

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
숙등 공유어울림파크 조성사업																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 도시재생뉴딜사업 공모 신청 ○ 국토부 도시재생 특별위원회 심의(확정) ○ 덕천동 도시재생활성화계획 고시 	
'21	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「덕천동 거리조성사업」 위·수탁협약체결 ▶ (재)부산디자인진흥원 ○ 「숙등 뭐든지 공유센터(주차장)」 공공건축심의위원회 심의 ○ 「누구나 생활서비스 센터」 개소 ▶ 미더덕 협동조합 운영 ○ 「골목 공유마당 케어사업」 시범사업 추진 	
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「숙등 뭐든지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업」 설계용역 착수 ○ 「2022년 숙등마을 도시재생 주민대학」 운영 용역 시행 ○ 「숙등 뭐든지 도전센터 조성사업」 설계용역 착수 ○ 「숙등마을 청춘문화축제」 개최 ○ 「숙등마을 덕천야시장」 개최 ○ 「골목 공유마당 케어사업」 시범사업 공사 준공 ○ 숙등마을 마을관리사회적협동조합 창립총회 개최 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 숙등마을 마을관리 사회적협동조합 설립인가 ○ 「숙등 뭐든지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업」 주민설명회 개최 ○ 「숙등 뭐든지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업」 계획 변경 ○ 숙등마을 바느질동아리 소인디자이너 자격증 취득 교실 운영 ○ 숙등마을 도시재생 상인대학 운영 ○ 숙등 뭐든지 공유센터(주차장, 공원) 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수 ○ 덕천동 도시재생사업 상생협약 참여자 모집 공고 ○ 덕천동 도시재생활성화계획 변경 주민공청회, 의회설명회 개최 	
'24	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을공동작업장(숙등 베이커리&카페) 개소 ○ 도시재생 활성화계획 변경 관련 관계기관 협의 ○ 덕천동 도시재생활성화계획 변경 주민공청회, 의회설명회 개최 ○ 도시재생 활성화계획 변경 요청 및 실현가능성 및 타당성 평가 실시 ○ 활성화계획 변경 관련 국토교통부 도시재생실무위원회 승인(원안 가결) ○ 공용건축물 협의(신축허가) 및 市 계약심사 완료 ○ 활성화계획 변경 관련 市 도시재생위원회 원안승인 ○ 덕천동 도시재생활성화계획 변경(2차) 완료(고시) ○ 「숙등 공유어울림파크」 신축공사 착공 	
'25	<ul style="list-style-type: none"> ○ 숙등 공유어울림파크 신축공사 설계용역 준공 및 BF예비인증, 녹색건축인증 완료 ○ 숙등마을 마을관리 사회적협동조합 공공지원금 교부 ○ 친환경건축 본인증 용역 발주 ○ 덕천동 도시재생활성화계획 변경(3차) 완료(고시) 	
'26	<ul style="list-style-type: none"> ○ (1차구간) 기초공사 완료 및 지하층 골조공사 완료 ○ (2차구간) 진행 중 	

6. 문제점 및 대책

- 해당 없음

7. 향후 추진계획

- 2026. 12. : 숙등 공유어울림파크 조성사업 준공 예정

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
24	4	-	8	

덕천동 도시재생사업 (위치도)



숙등 공유어울림파크 (조감도)



4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본구상 및 타당성 조사 등																	
복합교육문화센터 입지 확정 등																	
만덕1동 스포츠문화센터 건립 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행																	
신규사업 사전심사 및 국민체육센터 건립 지원사업 공모 등 사전행정절차 이행																	
지방재정투자심사 및 설계공모 등																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○'22.09.23. : 복합교육문화센터 건립 부지 확보를 위한 부산市 (공원정책과) 방문 ○'22.11.02. : 복합교육문화센터 건립부지 확보방안 마련 ※공원기능의 복합화 : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 추진 (공원유형변경 : 근린공원▷문화공원 변경) ○'22.11.08. ~ 12.30. : 관내 개발가능부지 조사 및 데이터 구축 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○'23. 01. 27. : 복합교육문화센터 건립 후보지 입지 분석 ○'23. 02. 06. : 복합교육문화센터 건립부지 선정 ○'23. 02. 27. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착공 ○'23. 05. 23. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회(1차) ○ ~ 06. 09. : 덕천·만덕권역 건립후보지 전면 재검토(6개소) ○'23. 06. 22. : 용역 설계변경(건립후보지 권역 확대) ○'23. 08. 04. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수 ○'23. 08. 28. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회(2차) ○'23. 08. 29.~ : 기본구상 및 타당성 조사 용역 일시중지(과업추가) - 후보지 3개소에 대한 건축계획(안), 부지정지계획(안), 접근 기반 시설 확보계획(안), 개략적인 공사비 산정 등 ○'23. 09. 07/09.25. : 도시관리계획결정(변경) 관련 부산시 협의(2회) ○'23. 10. 06. : 도시관리계획결정(변경) 관련 부산시 협의 ○'23. 11. 01. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 최종 보고회 ※ 건립후보지 3개소(백양공원, 개나리공원, 덕천생활체육공원) 선정 및 건립계획안 마련 등 ○'23. 12. 18. : 도시관리계획결정(변경)(안) 도시·건축 공동위원회 심의 ○'23. 12. 27. : 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면 고시 ※ 백양공원 유형변경 : 근린공원▷문화공원 	
'24	<ul style="list-style-type: none"> ○'24. 09. 02. : 市 「15분도시 비전투어 시즌2 북구편」 주민 제안 정책 과제 채택 ▶ 「만덕1동 스포츠문화센터 건립」 ※ 기존 6개 건립후보지 중 한곳인 물소리공원 공영주차장 부지 일원 ○'24. 09. 19. : 만덕1동 스포츠문화센터 건립 기본구상 용역 착수 ○'24. 10. 18. : 만덕1동 스포츠문화센터 건립 기본구상 용역 준공 	

연도	추진내용	비고
'25	○'25. 01. 14. : 만덕1동 스포츠문화센터 건립 타당성 조사 용역 착수 ○'25. 02. 12. : 만덕1동 스포츠문화센터 건립 타당성 조사 용역 준공 ○'25. 02.~04. : 복합문화체육센터 실무협의회 구성 및 운영 ※ 기존 후보지 3개소(백양공원, 개나리공원, 덕천생활체육공원) 중 개나리 공원 선정 ○'25. 03. : 2025년도 제1차 지방재정영향평가 심사 통과(조건부) ○'25. 04. : 2025년도 제3차 신규사업 사전심사 통과(조건부) ○'25. 06. : 2025년도 제2차 지방재정영향평가 심사 통과(조건부) ○'25. 06. : 2025년도 제5차 신규사업 사전심사 통과(조건부) ○'25. 07. : 2026년 생활체육시설(국민체육센터) 확충 지원사업 공모 신청 ▶ 2개소(만덕스포츠문화센터, 개나리공원문화체육센터) ○'25. 08. : 2026년 생활체육시설(국민체육센터) 확충 지원사업 재공모 신청 ▶ 2개소(만덕스포츠문화센터, 개나리공원문화체육센터) ○'25. 10. : 2026년 생활체육시설(국민체육센터) 확충 지원사업 공모 선정 ▶ 개나리공원문화체육센터 ○'25. 12. : 「만덕 스포츠문화센터 건립」 대체사업 관련 검토 보고 ○'25. 12. : 「만덕 생활체육문화센터 건립 기본구상 및 타당성 조사 용역」 실시	
'26	○'26. 01. : 2026년도 정기1차 지방재정투자사업 심사 의뢰(만덕생활체육문화센터) ○'26. 02. : 개나리공원 문화체육센터 건립 타당성 조사 용역 착수	

6. 문제점 및 대책

- 재정여건으로 인한 사업비(구비) 확보 애로
 - ▶ 중앙부처(문화체육관광부 등) 정책사업 공모 등을 통한 국·시비 확보
 - ▶ 정치권과의 유기적 소통 및 협력 등 사업비 확보를 위한 노력 지속

7. 향후 추진계획

- 2026. 4. : 2026년도 정기2차 지방재정투자사업 심사 의뢰(개나리공원 문화체육센터)

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	2회	5회	-	-

주관 부서	도서관과		협조 부서	건축과 공공건축팀	안전총괄과 기전관리팀	작성기준 2026.3.31.
	신선희(☎5572) 성종민(☎5582)			박진성(☎5164)	김병호(☎4672)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	계속	구	부산시 교육청 : 건물 및 토지 무상사용(20년간)			
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2020. 1. ~ 2025. 7.		13,696백만원	완료		100%	

1. 정책목표

- 복구형 권역별 공공도서관 완성으로 “도서관의 복구” 구현
- 아동친화적 도서관과 디지털 콘텐츠를 융합한 놀이형 복합문화공간 조성

2. 사업개요

- 추진기간 : 2020. 1월 ~ 2025. 7월
- 사업위치 : 의성로47번길 45-2(덕천여중 강당동)
- 사업규모 : 지상4층, 연면적 2,888.18㎡
- 사업내용 : 폐교시설 증축·리모델링을 통한 공공도서관 건립
- 소요예산 : 13,696백만원
 - 덕천도서관 건립 및 조성: 12,096백만원 (국 5,000 시 2,600 구 4,496)
 - 덕천도서관 어린이복합문화공간 조성: 1,600백만원 (시 1,120, 구 480)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	13,696	785	12,911	6,316	3,995	1,000	1,600			13,696	8,501	1,585	2,010	1,600	
국비	5,000	380	4,620	4,620						5,000	5,000				
시비	3,720	190	3,530		2,410		1,120			3,720	1,590		1,010	1,120	
구비	4,976	215	4,761	1,696	1,585	1,000	480			4,976	1,911	1,585	1,000	480	

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기존건축물 구조안전성 검토 용역	■	■													
기본 및 실시설계 용역	■	■	■	■											
중간보고회		■													
각종 심의 및 검토(협의)		■	■												
건축공사 착공 및 준공				■	■	■	■	■	■	■					
도서관 개관 준비											■	■	■		
도서관 개관 및 운영													■	■	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2020. 2.	○ 시교육청, 덕천여중 강당동 무상 사용승인 (20년간)	
2020. 2~11.	○ 기본계획수립, 생활SOC복합화사업 선정, 지방재정투자사업심사	
2021. 3~10.	○ 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축심의, 설계공모 추진	
2021. 11~23. 5.	○ 설계용역(기본실시설계, 도시관리계획, 구조안전성검토)	
2023. 5.	○ 설계용역 준공 및 공사발주·계약의뢰	
2023. 6.	○ 건축공사 착공	
2023. 11~24.10.	○ 인테리어 설계 용역 착수, 설계보고회 개최 및 용역 완료	
2024. 8.	○ 덕천도서관 TF팀 구성, 어린이복합문화공간 공모 선정	
2024. 12.	○ 건축 공사 준공 및 인테리어 공사 착공	
2025. 1~3.	○ 어린이복합문화공간 설계 완료, 디자인가구·ICT 협상 및 정보화시스템 구축, 개관장서 구입	
2025. 3.	○ 도서관 인테리어 공사 준공	
2025. 5~7.	○ 어린이복합문화공간 준공, 디자인가구 및 ICT시스템 구축, 개관장서 배가, 자료실 운영 준비	
2025. 7. 25.	○ 덕천도서관 개관	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 2026. 1. ~
 - ▶ 덕천도서관 운영 안정화 및 내실화

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	언론보도: 10건 방송보도: 3건	-

3-3

북부권역 미래교육센터 건립

주관 부서	교육체육과 교육지원팀	협조 부서		작성기준 2026.3.31.
	장은영(☎6165)			
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
'25. 1. 16.	완료	시교육청	부산시 교육청 시행	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2020년~2024년		17,856백만원	완료	100%

1. 정책목표

- 학교와 지역사회를 연계하고, 미래교육을 선도하는 거점센터 조성
- 미래 인재 양성을 위한 창의·융합형 교육 인프라 구축으로 교육도시 구현

2. 사업개요

- 추진기간 : 2020년 ~ 2025. 1. (※ 2025. 1. 16. 개관)
- 사업위치 : 의성로47번길 45-4 ([폐교]덕천여중 본관, 신관)
- 사업규모 : 지상 5층, 연면적 7,225.45㎡ (본관+신관)
- 사업내용 : 폐교 시설 리모델링을 통한 SW·AI 교육거점센터 건립

구분	시 설 명	용 도
1층	라운지D, 코지 아케이드, 뮤지엄D, 캔버스D, 아트스페이스	휴게 공간, 디지털 전시·체험, LED월 영상 관람, 미디어 아트 체험
2층	그라운드D, 데이터사이언스랩, 코딩랩	코딩 방탈출, 빅데이터 시각화 교육, 피지컬 컴퓨팅 교육
3층	AI스퀘어, 로봇파크, 메타버스랩	AI 활용 창작 교육, 로봇 코딩 체험, 가상공간 제작 교육
4층	e스포츠파크, 게임&사운드랩, AI크리에이티브랩, 뉴미디어스튜디오	e스포츠 강의·경기, 게임·사운드 디자인, AI 웹툰 제작, LED월 영상 제작 체험
5층	복합 다용도 교육공간	강의실, 세미나실, 온라인학교

- 소요예산 : 17,856백만원(부산시교육청)
 - ▶ 시설비 7,580백만원, 기자재 구입·설치 10,276백만원

3. 연도별 소요예산


(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획								확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내					임기후	계	'22	'23	'24	'25
			계	'22	'23	'24	'25						
계	17,856		17,856	2,742	4,868	10,246		17,856	2,742	4,868	10,246		
기타 (시교육청)	17,856		17,856	2,742	4,868	10,246		17,856	2,742	4,868	10,246		

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건축 설계	■	■													
건축공사 착공			■												
설립 계획 변경			■	■	■	■									
전시·체험물 설계 및 제작·설치 입찰							■	■							
인테리어 공사 및 기자재 설치								■	■	■	■				
개관												■			

5. 추진실적

연도	추진내용	사진
'20. 9월	○ 북부권역 미래교육센터 설립 기본계획 수립	
'22. 7월	○ 건축설계 용역 완료	
'23. 1월	○ 건축공사 착공	
'23. 3~7월	○ 설립 기본계획변경 확정	
'23. 8월	○ 자체 재정투자(재)심사 완료	
'23. 9~12월	○ 인테리어 설계 및 건축공사 준공	
'24. 5~6월	○ 전시·체험 콘텐츠 기본 및 실시설계	
'24. 7~12월	○ 인테리어 시공, 전시·체험물 설계 및 제작·설치	
'25. 1. 16.	○ 개관(부산광역시교육청교육연구정보원 SW·AI교육거점센터)	

주관 부서	복지정책과 돌봄지원팀	협조 부서	-	동 행정복지센터	작성기준 2026.3.31.
	문지혜(☎5151)		-	관련 담당자	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구	북구한의사회 무료 한방진료 지원, 비급여 지원 50%		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022~2026		82.5백만원	완료 후 계속	100%	

1. 정책목표

- 1인 가구 선정 등 복지안전망 강화를 위한 취약계층 지원대상 확대
- 임기 내 저소득 취약계층 1,200명(연 300명) 선정하여 한방 무료진료 추진

2. 사업개요

- 추진기간 : 2022. 7월 ~
- 사업위치 : 기초생활수급자, 차상위, 1인 가구, 다자녀가구 등 저소득 취약계층
- 사업규모 : 연300명 ※ 반기별 대상자 선정
- 사업내용
 - ▶ 복지부서, 동, 복지시설, 한의원 등을 통한 지원대상자 추천
 - ▶ 저소득 취약계층과 거주지 인근 한의원을 1:1로 매칭
 - ▶ 한의원 1개소당 지원대상자 10명 내외 매칭
 - ▶ 참여대상자 6개월간 주2회 치료 ▶ 총 48회
 - ▶ 일반진료 무료, 비급여 항목 1인 10만원 내 지원
 - ▶ 일상적인 질환 및 근골격계 만성질환 관리
- 소요예산 : 연 40,000천원(복구 50%, 한의원 50%)
 - ▶ 복구 이웃애 희망나눔 사업(공동모금회) 연계(전년대비 8,000천원 증액)
- 참여기관 : 북구청, 북구한의사회(정보한의원 외 26개소 참여)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	152.5	70	82.5	10.5	20.5	20.5	20.5	10.5	-	127	11	20.5	22.5	32.5	40.5
구비	9.5	7	2.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	3	1	0.5	0.5	0.5	0.5
기타 (민간)	143	63	80	10 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	10 구50% 한의원50%	-	124	10 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	22 구50% 한의원50%	32 구50% 한의원50%	40 구50% 한의원50%

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업협약체결		■															
『한방보듬이』 사업추진 (연300명, 임기 내 1,200명)			■		■		■		■		■		■		■		

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22 (3/4분기)	○ 한방보듬이 사업협약 체결 - 협약일자 및 대상 : 2022.11.9.(수), 북구한의사회 - 협약내용: 지원대상자 선정방법, 6개월 주2회 의료서비스 제공 ○ 한방보듬이 사업 추진 - '22년 하반기 대상자 선정 추진: 144명 - 비급여 지원 93명, 8,962천원(구50%,한의원50%)	
'23 (1/4분기)	○ 한방보듬이 상반기 사업 추진 - '23년 상반기 대상자 선정 추진: 총165명 - 사업 모니터링 : 참여자 모니터링(165명) → 미내원자 16명 대체선정(최종 165명)	
'23 (2/4분기)	○ 한방보듬이 상반기 사업 추진 - '23년 상반기 대상자 한방진료 건강관리 : 총165명 ○ 한방보듬이 하반기 지원대상자 선정 추진 - 관련 부서·동·관내 종합사회복지관 대상자 추천협조 공문 발송('23.6.19)	
'23 (3/4분기)	○ 한방보듬이 상반기 사업 정산 ▶'23.7월 - '23년 상반기 비급여 의료비지원: 120명, 14,731천원(구50%,한의원50%) ○ 한방보듬이 하반기 사업 추진 - '23년 하반기 대상자 선정 추진('23.7월): 총156명 - 사업 모니터링('23.9월) ▶ 참여자 모니터링(156명) → 미내원자 9명 대체선정(최종 156명)	

연도	추진내용	비고
'23 (4/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방보듬이 2023년 하반기 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '23년 하반기 대상자 의료지원: 156명 - '23년 하반기 비급여 의료비 지원: 107명, 8,520천원(구^{50%},한의원^{50%}) ○ 2024년도 상반기 사업계획 수립 *복지정책과-46655호(2023.12.21.)호 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 부서·동·관내 복지관 2024년 상반기 대상자 추천협조('23.12.21) 	
'24 (1/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방보듬이 상반기 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '24년 상반기 대상자 선정 추진: 총160명 - 사업 모니터링 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 참여자 모니터링(160명) → 미내원자 18명 대체선정(최종 160명) 	
'24 (2/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방보듬이 참여 한의원 확대 : 25개소 → 26개소(이전1, 신규2) <ul style="list-style-type: none"> - 2개소(해와달한의원, 성혜당한의원) ○ 한방보듬이 하반기 지원대상자 선정 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 부서·동·관내 종합사회복지관 대상자 추천협조 공문 발송('24.6.17) - 2024 하반기 한방보듬이 대상자 선정(180명) 	
'24 (3/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방보듬이 상반기 사업 정산 ▶'24.7월 <ul style="list-style-type: none"> - '24년 상반기 비급여 의료비지원: 109명, 9,810천원(구^{50%},한의원^{50%}) ○ 한방보듬이 하반기 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '24년 하반기 대상자 선정 추진('24.7월): 총180명 - 사업 모니터링('24.9월) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 참여자 모니터링(180명) → 미내원자 24명 대체선정(최종 182명) 	
'24 (4/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방보듬이 2024년 하반기 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '24년 하반기 대상자 의료지원: 182명 - '24년 하반기 비급여 의료비 지원: 150명, 12,088천원(구^{50%},한의원^{50%}) ○ 2025년도 상반기 사업계획 수립 *복지정책과-50226호(2024.12.23.)호 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 부서·동·관내 복지관 2025년 상반기 대상자 추천협조('24.12.24.) 	
'25 (1/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방보듬이 참여 한의원 확대 : 26개소 → 27개소(신규1) <ul style="list-style-type: none"> - 1개소(동문한의원) ○ 한방보듬이 상반기 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '25년 상반기 대상자 선정 추진: 총183명 - 사업 모니터링('25.3월) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 참여자 모니터링(183명) → 미내원자 21명 대체선정(최종 183명) 	
'25 (2/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방보듬이 하반기 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '25년 하반기 대상자 선정 추진: 총172명 ○ 한의약 건강돌봄사업 성과대회 평가자료 제출 → 우수지자체 선정 	
'25 (3/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방보듬이 상반기 사업 정산 ▶'25.7월 <ul style="list-style-type: none"> - '25년 상반기 비급여 의료비지원: 137명, 9,294천원(구^{50%},한의원^{50%}) ○ 한방보듬이 하반기 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 모니터링('25.9월) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 참여자 모니터링(172명) → 미내원자 16명 대체선정(최종 171명) 	

연도	추진내용	비고
'25 (4/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방보듬이 2025년 하반기 사업 추진 - '25년 하반기 비급여 의료비 지원: 171명, 6,706천원(구^{50%},한의원^{50%}) ○ 2026년도 상반기 사업계획 수립 *복지정책과-50725호(2025.12.24.)호 - 관련 부서·동·관내 복지관 2026 상반기 대상자 추천협조('25.12.24.) 	
'26 (1/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방보듬이 참여 대상 기준 확대 : 수급자, 1인가구, 다자녀가구 등 ○ 한방보듬이 상반기 사업 추진 - '26년 상반기 대상자 선정 추진 : 총 150명 - '26년 3월 기준 추가 대상자 선정 추진 : 35명 추가, 총 185명 예정 - 사업 모니터링('26.3월) ▶ 참여자 모니터링(150명) → 미내원자 15명 대체선정(최종 150명) 	

6. 문제점 및 대책

- 비급여 진료 희망자 증가에 따라 2026년 예산 40,000천원 확보
(작년 대비 8,000천원 증액 - 구^{50%},한의원^{50%})

7. 향후 추진계획

- 2026년 상반기 대상자 비급여 진료비 지원 : '26년 6월
- 2026년 하반기 대상자 추천 및 선정 : '26년 6월
- 2026년 하반기 대상자 이용 모니터링 추진 : '26년 8월

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	2026년 상반기 지원대상자 유선 모니터링 (이용내역 및 불편사항 등)	-	-	-

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
다올하우스 입·퇴소 관리	[Blue bar]																
보담하우스 입주자 모집 및 선정	[Blue bar]																
커뮤니티실 운영 (보담·도담하우스)	[Blue bar]																
어울림센터 프로그램 이용	[Blue bar]																
사업보고 및 간담회		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 40명 입소(구포11, 금곡29) - 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 모집(2회) 및 선정(11가구) - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(연간 12회) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(31개 프로그램 운영, 18,987명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 연간 6회 	
'23. 1~3.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 7명 입소(구포2, 금곡5) - 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 모집(1회) 및 선정(3가구) - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(35개 프로그램 운영, 3,378명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 2회 	
'23. 4~6.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 10명 입소(금곡10) - 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 모집(1회) 및 선정(2가구) - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(31개 프로그램 운영, 3,854명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 3회 	

연도	추진내용	비고
'23. 7~9.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 14명 입소(구포3, 금곡11) - 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집 - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(37개 프로그램 운영, 3,863명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 1회 	
'23. 10~12	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 9명 입소(구포3, 금곡6) - 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집 - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(37개 프로그램 운영, 4,771명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 3회 	
'24. 1~3.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 7명 입소(금곡7) - 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집 및 선정 - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(18개 프로그램 운영, 3,581명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 2회 	
'24. 4~6.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 8명 입소(금곡8) - 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집 및 선정 - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(31개 프로그램 운영, 5,412명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 1회 	
'24. 7~9.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 3명 입소(금곡3) - 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집 및 선정 - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(33개 프로그램 운영, 6,043명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 2회 	

연도	추진내용	비고
'24 10~12	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 9명 입소(금곡9) - 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집 및 선정 - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(33개 프로그램 운영, 7,290명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 2회 	
'25. 1~3	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 6명 입소(금곡6) - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(29개 프로그램 운영, 3,744명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 1회 	
'25. 4~6	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 4명 입소(금곡4) - 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(29개 프로그램 운영, 5,380명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 1회 	
'25. 7~9	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 7명 입소(금곡7) - 보담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(29개 프로그램 운영, 6,307명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 2회 	
'25. 10~12	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 3명 입소(금곡3) - 보담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(29개 프로그램 운영, 6,486명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 1회 	
'26. 1~3	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 1명 입소(금곡1) - 보담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월) ○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림센터 프로그램 이용인원(23개 프로그램 운영, 1,887명 이용) ○ 사업보고 및 간담회 등 : 2회 	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 행정복지센터, 제공기관 등 담당자 교육 : 상·하반기 연 2회
- 수행기관 간담회 개최, 북구365 돌봄뜰·Talk 운영
- 구청, 행정복지센터 통합지원회의 : 월 2회 실시
- 사업 모니터링 실시 : 행정복지센터, 제공기관 등 2026년 하반기
- 사업 성과공유회 개최 : 2026년 12월 예정




8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회 민간전문가자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	4(지역케어회의 등)	12(언론보도)	20(간담회 등)

○ 위원회, 민간전문가 자문 등 ▶ 총 4회

- 2023. 03. 14. : 제1차 통합돌봄 區지역케어회의 ‘보담하우스 입주자 선정’
- 2023. 06. 01. : 제2차 통합돌봄 區지역케어회의 ‘보담하우스 입주자 선정’
- 2023. 10. 16. : 제3차 통합돌봄 區지역케어회의 ‘보담하우스 입주자 선정’
- 2023. 11. 16. : 제4차 통합돌봄 區지역케어회의 ‘보담하우스 입주자 선정’

○ 언론, 방송보도 ▶ 총 12회

<p>부산 북구, 초고령사회 대비하는 '부산형 통합돌봄' 추진</p> <p>부산 북구, 앞선 통합돌봄 사업으로 벤치마킹 이어져</p>  <p>2023. 4. 7. 국제뉴스</p>	<p>부산 북구, 앞선 통합돌봄 사업으로 벤치마킹 이어져</p> <p>부산 북구, 앞선 통합돌봄 사업으로 여러 지방자치단체의 벤치마킹이 이어지고 있다고 19일 밝혔다.</p>  <p>2023. 5. 19. 뉴스프리존</p>	<p>BUSAN.com</p> <p>부산 북구 통합돌봄사업 '돌봄활동가' 역량강화교육 실시</p>  <p>2023. 8. 31. 부산일보</p>
---	---	---

  <p>2023. 9. 14. 부산일보</p>	  <p>2023. 12. 5. 중도일보</p>	  <p>2024. 4. 1. 국민일보</p>
  <p>2024. 6. 20. 국제신문</p>	  <p>2024. 12. 18. 국제신문</p>	  <p>2025. 2. 11. 부산일보</p>
  <p>2025. 4. 16. 국제신문</p>	  <p>2025. 12. 18. 국제신문</p>	  <p>2026. 02. 13. 부산일보</p>

○ 기타 ▶ 총 20회 (수행기관 간담회 등 20회)

- 2023. 02. 09. : 제1차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 04. 24. : 제2차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 06. 23. : 제3차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)

- 2023. 08. 30. : 제4차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 10. 30. : 제5차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 12. 07. : 제6차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2024. 01. 18. : 2024년 제1차 부산, 함께돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2024. 03. 27. : 2024년 제2차 부산, 함께돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2024. 05. 31. : 2024년 제3차 부산, 함께돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2024. 07. 24. : 2024년 제4차 부산, 함께돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2024. 09. 24. : 2024년 제5차 부산, 함께돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2024. 10.~11. : 2024년 부산, 함께돌봄 사업 모니터링 실시
- 2024. 12. 16. : 2024년 부산, 함께돌봄 성과공유회 및 역량강화 교육
- 2025. 01. 21. : 2025년 제1차 부산, 함께돌봄 제공기관 회의(간담회)
- 2025. 04. 01. : 2025년 제2차 부산, 함께돌봄 제공기관 회의(간담회)
- 2025. 07. 21. : 2025년 제3차 부산, 함께돌봄 제공기관 회의(간담회)
- 2025. 08.~09. : 2025년 부산, 함께돌봄 사업 모니터링 및 현장점검 실시
- 2025. 12. 16. : 2025년 부산, 함께돌봄 성과공유 및 소진예방 교육
- 2026. 02. 12. : 2026년 제1차 통합돌봄 지원사업 제공기관 회의
- 2026. 03. 13. : 2026년 부산, 함께돌봄 사업 내실화를 위한 TF팀 회의

4-2

의성로 도로 확대 및 고속도로 접속로 확장

주관 부서	건설과 도시계획팀	협조 부서	부산광역시 공원정책과		작성기준 2026.03.31.
	진건우(☎4734)		김현영(051-888-3784)		
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기 후	계속	민간, 광역(시)	부산광역시에서 추진 중인 덕천공원 민간공원 조성 특례사업과 병행하여 도로 확장 사업 추진		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023. ~ 2028.		3,000백만원	정상추진	30%	

1. 정책목표

- 낙동고등학교 앞 교차로에서 남해고속도로 접속로 일원의 약 220m구간 1차선(B=3m) 추가 확폭 및 기반시설 정비하여 인근 구간 교통체증 해소

2. 사업개요

- 추진기간 : 2023. ~ 2028.
 - 사업위치 : 부산광역시 북구 덕천동 444-15번지 일원
 - 사업규모 : 도로 확폭(B=3m, L=220m, 1차선 추가) 및 기반시설 정비
 - 사업내용 : 부산광역시에서 추진 중인 덕천공원 민간공원 조성 특례사업과 병행하여 도로 확장 사업 추진 협의 및 사업비 확보
 - 소요예산 : 3,000백만원(민간)
- * 현재('26. 3.) 도시관리계획(용도지역) 결정(변경)단계 → 주택건설사업승인단계 [지구단위계획 결정('26. 6.~'26. 12. 예정)] → 도로 공사 추진('27.) → 공사 완료('28. 예정)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획								확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내					임기후	계	'23	'24	'25	'26	27
			계	'23	'24	'25	'26							
계	3,000	-	3,000	-	-	300	600	2,100	-	-	-	300	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타(민간)	3,000	-	3,000	-	-	300	600	2,100	-	-	-	300	-	-

4. 추진계획

구분	'23	'24	'25				'26				'27				'28		비고
	1~4	1~4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업 추진을 위한 행정절차 이행																	
본 공사 추진																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'24. 09.	○ 부산광역시 국가유산위원회(문화재 현상변경) 심의 (조건부 가결 : 문화유산보존정책 구체화 등)	
'24. 12.	○ 부산광역시 도시계획 위원회 심의 (수정의결 : 건축계획 재검토 등)	
'25. 07.	○ 도시관리계획(덕천공원 조성계획) 결정(변경) 고시 (비공원시설 규모 : 공동주택용지+도로 면적 변경)	

6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

7. 향후 추진계획

- 도시관리계획(용도지역) 결정(변경) 후, 덕천공원 민간공원 조성 사업 진행 절차에 맞춰 관련기관과 지속 협의 및 사업 추진

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

사업추진 관련 사진 (위치도 및 현장사진)



도로 사진(3차로 구간)



도로 사진(2차로 구간)

4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'24				'25				'26				'27				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
본 공사 추진																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'16	○교통체계 개선사업(회차로) 설치계획 결정	
'17	○실시설계용역 완료	
'22	○공사착공 ※ 건설사업관리용역 착수(2022.6)	
'25	○공사추진[제방도로측 옹벽(1~3번) 가시설 및 복합말뚝 시공 중] ※ 시공사 계약포기 각서 제출(7.29.) → 재입찰	
'26	○잔여공사 재입찰 및 착공(2월)에 따른 잔여공사 추진	

6. 문제점 및 대책

○ 기존 25년 11월 준공이었으나, 시공사 계약 포기 등 재입찰로 인하여 공사 준공기한이 연장되어 주민 불편 사항 추가 발생 → 건설본부와 체계적인 소통, 협조로 공사 조기 준공할 수 있도록 시행 예정

7. 향후 추진계획

○ 2027. 02. : 공사 준공


위치도 및 현장사진(조감도)

- <중, 사업개요>**
- 위치 : 북구 광역대교 급곡과천교 교차지점
 - 사업규모
 - 도로건설 L=1.2km, B=4.5m(교량 L=278m)
 - 사업비 : 23,608백만원
(공사 21,583, 보상 -, 기타 2,046)
 - 사업기간 : 2021~2025

- <2023년 이전 투자>**
- 사업규모
 - 도로건설 L=450m, B=4.5m
 - 사업비 : 10,717백만원
(공사 9,801, 보상 -, 기타 1,116)

- <2024년 투자구간>**
- 사업규모
 - 도로건설 L=250m, B=4.5m
 - 사업비 : 3,000백만원
(공사 2,500, 보상 -, 기타 500)

- <2025년 투자구간>**
- 사업규모
 - 도로건설 L=500m, B=4.5m, 교량2개소,
도로포장 A=9,500㎡
 - 사업비 : 9,892백만원
(공사 9,482, 보상 -, 기타 430)

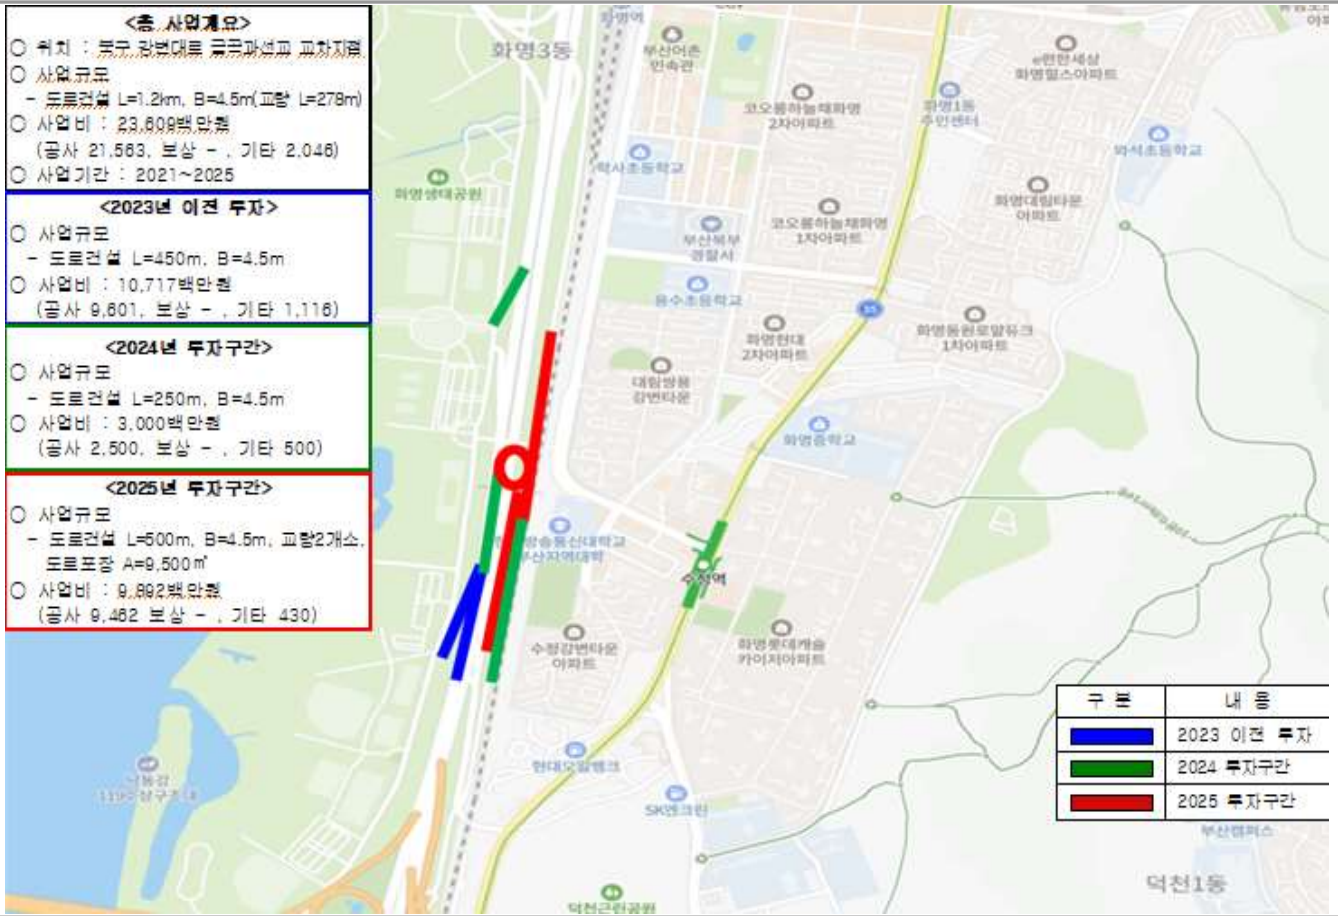

구분	내용
■	2023 이전 투자
■	2024 투자구간
■	2025 투자구간



4-4

만덕3터널 조기 완공

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	市 도로계획과	市 건설본부 도로건설2팀	작성기준 2026.03.31.
	김보현(☎4692)		최용석(☎888-2722)	이진우(☎888-6185)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	광역시	부산시 사업시행		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2016. 01. ~ 2023. 04.		- (148,560백만원 별도)	완료	100%	

1. 정책목표

- 덕천동 ~ 아시아드주경기장 간(만덕3터널) 도로건설 준공 지원

2. 사업개요

- 위 치 : 덕천동 은마아파트 ~ 연제구 거제동 부산개인 택시회관
- 사업내용 : 우회도로 개설 L=4.370km, B=20~45m(4차로)
 - ▷ 도로정비 L=1,680m, 터널 L=2,173m, 접속도로 L=517m
- 소요예산 : 148,560백만원(국 63,897, 시 84,663)
- 사업기간 : 2016. 01. ~ 2023. 06.
- 시행주체 : 부산광역시 도로계획과(건설본부)

3. 연도별 소요예산

- 자체예산 없음(협력지원사업)

4. 추진계획

- 부산시 추진일정

구분	'17				'20				'23				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
본 공사 추진																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'12	○2차 대도시권 교통 혼잡도로 지정	
'16	○공사 착공	
'18	○만덕3터널 굴착 착수(2020. 6.: 만덕3터널 관통)	
'22	○만덕교 가설(구조물 상부공) 시공	
'23	○방음터널, 방음벽, 기타 도로 및 교통시설물 설치 완료	'23. 7. 1. 개통

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

위치도 및 현장사진(조감도)



5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'18	○사업시행자 지정 및 실시협약 체결 ○실시설계	
'19	○공사 착공 [1공구 롯데건설(주), 2공구 GS건설(주)]	
'23	○IC 3개소, 공기정화시설 및 터널 굴착	
'24	○전 구간(지하도로 L=9,620m 관통)(24. 9. 6.)	
'25	○LU형 측구 설치, 풍도슬라브 설치, 터널 타일 설치	
'26	○만덕~센텀 도시고속화도로 개통	26.2.10. 전면개통


6. 문제점 및 대책

- 첨두시간 남해고속도로 진입구간 교통정체에 따른 교통체계 개선 필요

7. 향후 추진계획

- 만덕~센텀 고속화도로 시종점부 도로구조개선 용역 추진(市도로계획과)
- 市도로계획과 등 관련 부서와 지속적인 협조로 원활한 교통흐름을 확보하고 주민의 불편을 최소화 하도록 함

위치도 및 현장사진(조감도)

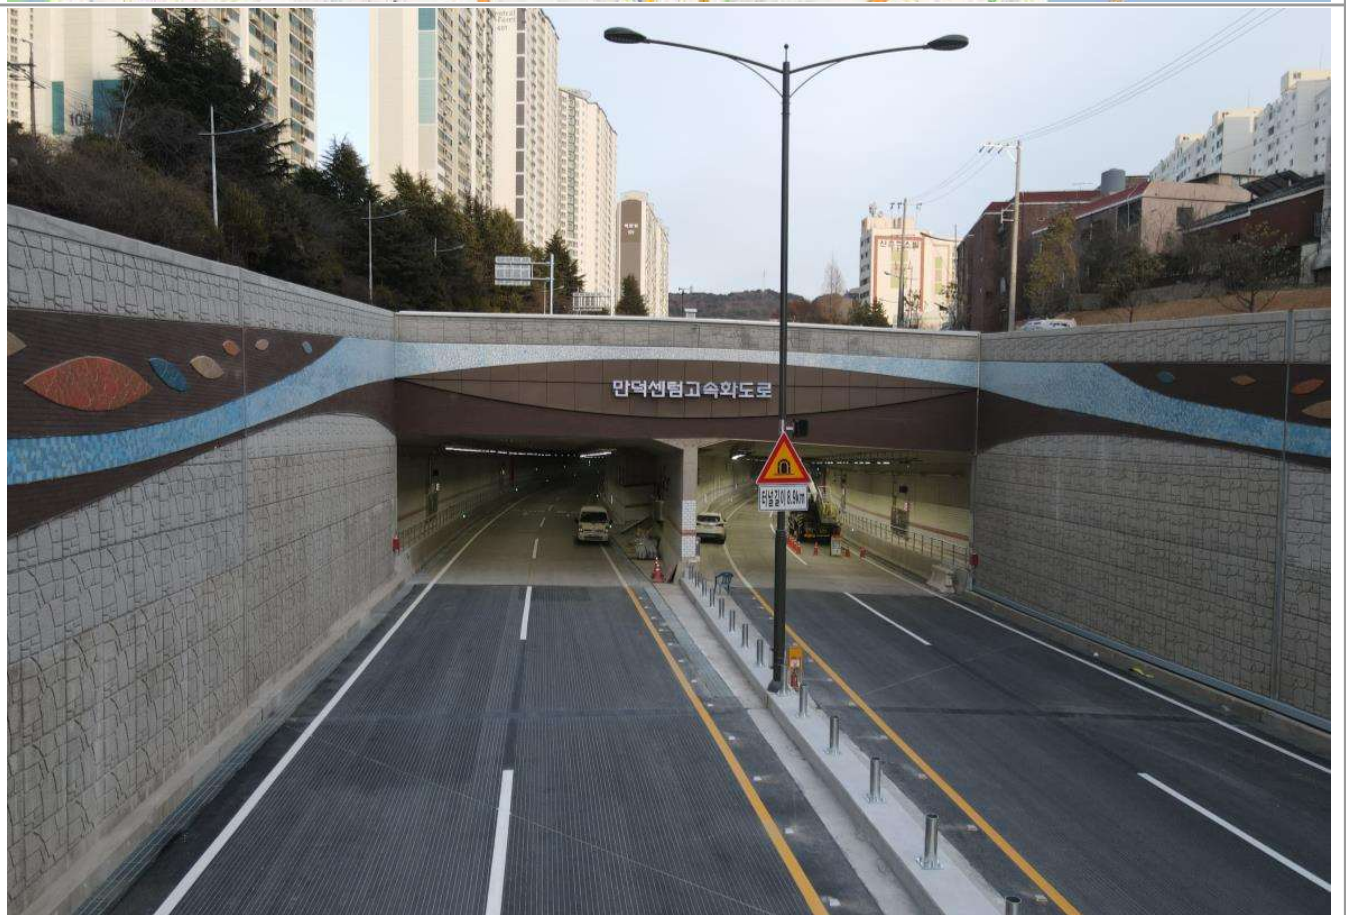

4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'22	'23				'24				'25				'26				'27			비고	
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
광역도로 연결 착공 및 공사																						

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○공사 착공	
'24	○공사 추진	
'25	○공사 추진	
'26	○공사 추진(상부 슬래브 공사 중)	

6. 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	부산광역시 도시공간계획과	작성기준 2026.03.31.
	권경윤(☎4694)		김영준(051-888-2445)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기 후	계속	기초(구)		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2023. ~ 2028.		5,600백만원	정상추진	30%

1. 정책목표

- 기조성된 대천천 누리길과 인근 화명수목원을 연계한 순환생태탐방로 개설을 통해 도시민의 건전한 휴식공간 제공 및 지역 명소 조성

2. 사업개요

- 추진기간 : 2023. ~ 2028.
- 사업위치 : 부산광역시 북구 화명동 88번지 일원
- 사업규모 : 순환생태탐방로 조성 L=320m, B=1.5m~2m
▷ 보행교 설치 L=150m, B=1.5m, 산책로 조성 L=170m, B=2m 등
- 사업내용 : 기조성된 대천천 누리길과 인근 화명수목원을 연계한 순환생태탐방로 개설을 통해 도시민의 건전한 휴식공간 제공 및 지역 명소 조성
- 소요예산 : 5,600백만원[국 1,572(28%), 시 1,000(18%), 구 228(4%), 특교세 및 특교금 2,800(50%)]
* 미확보액: 2,100백만원(특교세 및 특교금)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획								확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내				임기후	계	'23	'24	'25	'26	
			계	'23	'24	'25							'26
계	5,600	-	5,600	100	-	2,700	1,200	1,600	3,500	100	-	2,700	700
국비	1,572	-	1,572	72	-	1,500	-	-	1,572	72	-	1,500	-
시비	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-
구비	228	-	228	28	-	200	-	-	228	28	-	200	-
특교금·세	2,800	-	2,800	-	-	-	1,200	1,600	700	-	-	-	700

4. 추진계획

구분	'23	'24	'25	'26				'27				'28				비고
	1~4	1~4	1~4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 추진을 위한 행정절차 등 이행																
본 공사 추진																

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23	○ 2023년 개발제한구역 주민지원사업(환경문화사업) 선정	
'24	○ 2025년 개발제한구역 주민지원사업 선정	
'25	○ 신기술·특허 공법선정 위원회 심의 ○ 북구 경관심의위원회 심의 ○ 도시관리계획(공공공지) 결정(안) 열람공고 및 의견협의	
'26	○ 설계안전성 검토 용역 착수 ○ 도시계획위원회 개최[도시관리계획(공공공지) 결정(신설)(안)]	

6. 문제점 및 대책

- 추가 재원확보 방안 마련 필요(공사비 2,100백만원)

7. 향후 추진계획

- 사전 행정절차(도시관리계획(공공공지) 결정, 설계안전성 검토 등) 이행 후 공사 추진 예정

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

사업추진 관련 사진 (위치도 및 조감도)



주관 부서	교육체육과 체육지원팀	협조 부서	시 낙동강관리본부 시 관광정책과	건설과 생태하천팀	작성기준
	윤영규(☎4124) 정해민(☎4121)		이미진(☎310-6022) 이정민(☎888-5292)	양우섭(☎4924)	2026.3.31.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기 내	계속	부산광역시, 북구	해당 사항 없음		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022년~계속		4,124백만원	완료 후 계속	100%	

1. 정책목표

- 화명생태공원 추가 조성중인 파크골프장(27홀) 조속한 개장 및 축구장 3개면(당초 2개면) 인조잔디 조성
- 지역별 특화 해양레포츠 육성사업을 통한 수상레포츠 시설 이용 활성화

2. 사업개요

□ 화명생태공원 체육시설 조성

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2024. 5.
- 사 업 비 : 3,888백만원 정도
 - 축구장 : 3,000백만원(특교금 2,000, 시 1,000) / 파크골프장 : 888백만원(국 344, 시 544)
- 사업주체 : 부산광역시 북구청 / 부산광역시 낙동강관리본부
- 사업내용 : 파크골프장 27홀 신규조성, 축구장 A, B, D면 인조잔디 조성

□ 지역별 특화 해양레포츠 육성사업

- 사 업 명 : 낙동강 힐링해양스포츠 체험 프로그램 추진
 - ※ 부산광역시 관광정책과의 공모사업 신청을 통한 사업 추진
- 사업목적 : 해양레저스포츠 체험교실을 통한 구민 체력 증진 및 해양레포츠 문화 저변 확대
- 장 소 : 화명수상레포츠타운(북구 강변대로 1629)
- 사업대상 : 8세 이상 청소년 및 일반성인 등
- 주요내용 : 웨이크보드, 수상스키, 워터슬라이드 등 체험교실 운영
- 사 업 비 : 236백만원(시비 185, 구비 51)
- 주최/주관 : 부산광역시·북구/화명수상레포츠타운

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						계	'22	'23	'24	'25	'26	
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	4,124	500	3,624	432	3,044	44	44	60	4142.5	932	3,060.5	90	60		
국비	2,344	150	2,194	194	2,000				2,344	344	2,000				
시비	1,729	350	1,379	229	1,035	35	35	45	1,747	579	1,048	75	45		
구비	51		51	9	9	9	9	15	51.5	9	12.5	15	15		
기타 (민간)															

4. 추진계획

구 분	2022		2023				2024				2025				2026		비 고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
파크골프장 신규 24홀 조성	■	■															
파크골프장 27홀 조성완료(3홀추가)			■	■													
축구장 사업비 확보	■	■															
축구장 공사						■	■	■	■								
축구장 정상개장							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
해양레포츠 육성사업 공모신청			■					■				■				■	
해양레포츠 육성사업 추진				■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 화명생태공원 파크골프장 신규 24홀 조성공사 준공 후 임시개방('22. 10.) ▷ 市 낙동강관리본부	
'23	○ 화명생태공원 파크골프장 27홀 조성 ○ 공약사항 변경 : 축구장 인조잔디 조성(2개면→3개면) ('23. 2.) ○ 화명생태공원 내 운동장(A, B, D면) 인조잔디 조성 협의 ▷ 市 체육진흥과, 낙동강관리본부	
	○ 2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진완료('23. 9.)	
'24	○ 화명생태공원 축구장 인조잔디 조성공사 준공('24. 1.) ○ 화명생태공원 축구장 A구장 조명탑 설치공사 완료('24. 5.)	
	○ 2024년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진완료('24. 10.)	
'25	○ 2025년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진완료('25. 9.)	
'26	○ 2026년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 공모신청 완료('26. 3.)	

6. 문제점 및 대책

- 해당 없음

7. 향후 추진계획

- 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진(市 공모 선정 시): 2026. 5. ~ 9.
 - ▶ 공모 결과발표: 2026. 3월 말(예정)

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해	당	없	음	

사업추진 관련 사진



사업 위치도



현장사진(축구장)



현장사진(파크골프장)

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)	■	■															
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)			■	■	■	■	■	■	■	■							
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)											■	■	■	■	■		

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 천사공원, 명진공원 내 물놀이형 바닥분수 조성 및 운영(2개소)	
'23	○ 용당공원, 희망공원, 풀소리공원 물놀이장 조성 완료(3개소) - 특별교부세 700백만원(용당, 희망공원), 시비 450백만원(풀소리공원) 확보 ○ 대천천수변공원 물놀이장 조성 예산 확보(특별교부세 500백만원)	
'24	○ 대천천수변공원 물놀이장 조성 완료 및 운영(1개소)	
'25	○ 와석공원 물놀이장 조성 완료(1개소) ○ 하얀마음공원 물놀이장 조성 완료(1개소)	

6. 문제점 및 대책

- 「어린이놀이시설 안전관리법 시행규칙」 제16조의2에 의한 안전관리자 배치 필요
- 수경시설 관리 대상 증가로 시설 운영 애로
 - ▷ 전문기관 위탁 운영을 위한 예산확보 필수

7. 향후 추진계획

- 정기정검을 통한 물놀이형 수경시설물 유지 관리

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
· 2022.1.25.: 주민설명회 개최 (천사공원) · 2022.2.17.: 주민설명회 개최 (명진공원)			· 2022.8.7.: 북구 '천사공원 물놀이장 개장' 부산mbc 등 6건	
· 2023.1.17.: 주민설명회 개최 (용당공원) · 2023.2.17.: 주민설명회 개최 (희망공원) · 2023.3.7.: 2차 주민설명회 개최 (용당공원) · 2023.3.29.: 3차 주민설명회 개최 (용당공원) · 2023.12.14.: 1차 주민설명회 개최 (대천천수변공원) · 2023.12.21.: 2차 주민설명회 개최 (대천천수변공원)		· 2023.3.: 품질향상단 자문단 운영		
· 2024.7.25.: 주민설명회 개최 (하얀마음공원)			· 2024.7.17.: 북구 '공원물놀이장 5곳 개장' 국제뉴스 등 2건	
· 2025.2.12.: 1차 주민설명회 개최 (와석공원) · 2025.2.18.: 2차 주민설명회 개최 (와석공원)			· 2025.9.1.: 북구 '공원 물놀이장 운영종료' 위클리오늘 1건	

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
노면정비, 휴양시설(전망대, 데크시설물) 정비, 산성로목수국식재	■	■															
명상숲등 테마공간조성, 산성로목수국식재			■	■	■	■											
테마공간 및 수국 육성							■	■	■	■							
노선별스토링텔링,주민참여 걷기, 수국 등 문화행사 추진												■	■	■	■	■	■

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'21년 이전	○ 금정산 누리길 조성공사(1차) 완료 - 300백만원(국 270, 구 30) ○ 산성로목수국식재(목수국 등 2종 5,710주) 100백만원	
'22	○ 금정산 누리길 조성공사(2차) 완료 - 1,000백만원(국 900, 구 100) ○ 산성로목수국식재(목수국 등 2종 6,000주 식재) 50백만원	
'23	○ 금정산 누리길 조성공사(3차) 완료 - 500백만원(국 450, 구 50) ○ 산성로 수국 식재(원예수국 등 2종 1,050주 식재) 50백만원	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 정기 점검을 통한 금정산 누리길 및 수국길 유지 관리

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 조성 등 도시숲 4개소 조성																	
간미끄럼틀 썸지공원 조성 등 도시숲 3개소 조성																	
화명대로 가로화단 조성 등 도시숲 3개소 조성																	
만덕고개길 도시숲 조성 등 도시숲 6개소 조성																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 및 도시숲 4개소 조성 완료 - 상계봉 여가녹지 꽃길 조성(4km) 완료 - 자녀안심 그린숲 조성(학사초) 완료 - 만덕중학교 옆 차 없는 거리 조성 완료 - 구포2동 행정복지센터 주민쉼터 조성 완료 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 조성 3개소 조성 완료 - 간미끄럼틀 썸지공원 리모델링사업 완료 - 금곡역 하부 도시숲 조성사업 완료 - 자녀안심 그린숲 조성사업 완료 ○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 수목 식재 완료 - 먼지털이기 ~ 여가녹지 입구구간 철쭉길 조성 	
'24	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 조성 3개소 조성 완료 - 구포 삼각화단 조성 완료 - 화명대로 가로화단 조성사업 완료 - 만덕신성경로당 앞 주민쉼터 조성사업 완료 	
'25	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 조성 6개소 조성 완료 - 구포1동 주민쉼터 조성사업 완료 - 만덕 회전교차로 교통섬 화단 조성 완료 - 구포 유림아파트 회전교차로 교통섬 화단 조성 완료 - 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업 2차 조성완료 - 만덕3로 주민쉼터 조성사업 조성완료 - 만덕대로 거리환경 정비공사 완료 	

6. 문제점 및 대책

- 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업(2차) 초화류, 자생식물 식재 등으로 지속적인 유지·관리 필요

⇒ 준공 후 전문업체 관리 및 기간제근로자 투입으로 유지관리 시행


7. 향후 추진계획

- 도시 내 유휴지를 활용하여 쉽게 접근할 수 있는 도시숲 제공


8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송 보도	기타
<ul style="list-style-type: none"> · 2023.3.30.:1차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 씬지공원 리모델링사업) · 2023.4.12.:2차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 씬지공원 리모델링사업) · 2024.2.7.:주민설명회개최 (와석공원 정비사업) · 2025.2.12.: '25년 1차 주민설명회개최 (와석공원 정비사업) · 2025.2.18.: '25년 2차 주민설명회개최 (와석공원 정비사업) 		<ul style="list-style-type: none"> · 2023.3.20.:자재선정위원회 개최 (대천천 보행 산책로 정비사업) · 2022.12.7.:공사품질 점검단 운영 (금곡역 하부 도시숲 조성사업) · 2024.3.7. 제1회 도시공원위원회 심의 (와석공원 정비사업) · 2025.6.9. 2025년 제3차 도시숲 심의 (만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업 2차) 	-	-

구포1동 주민센터 조성사업

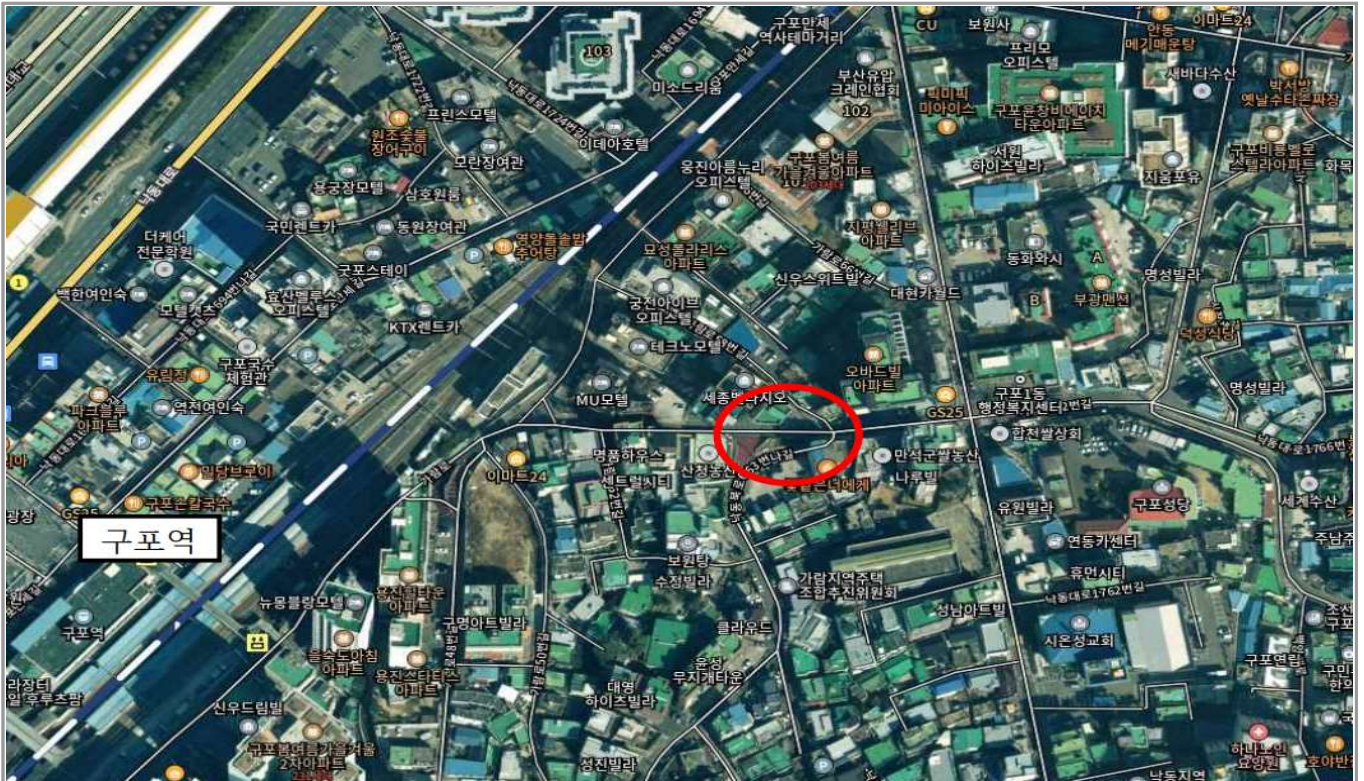

위 치 도

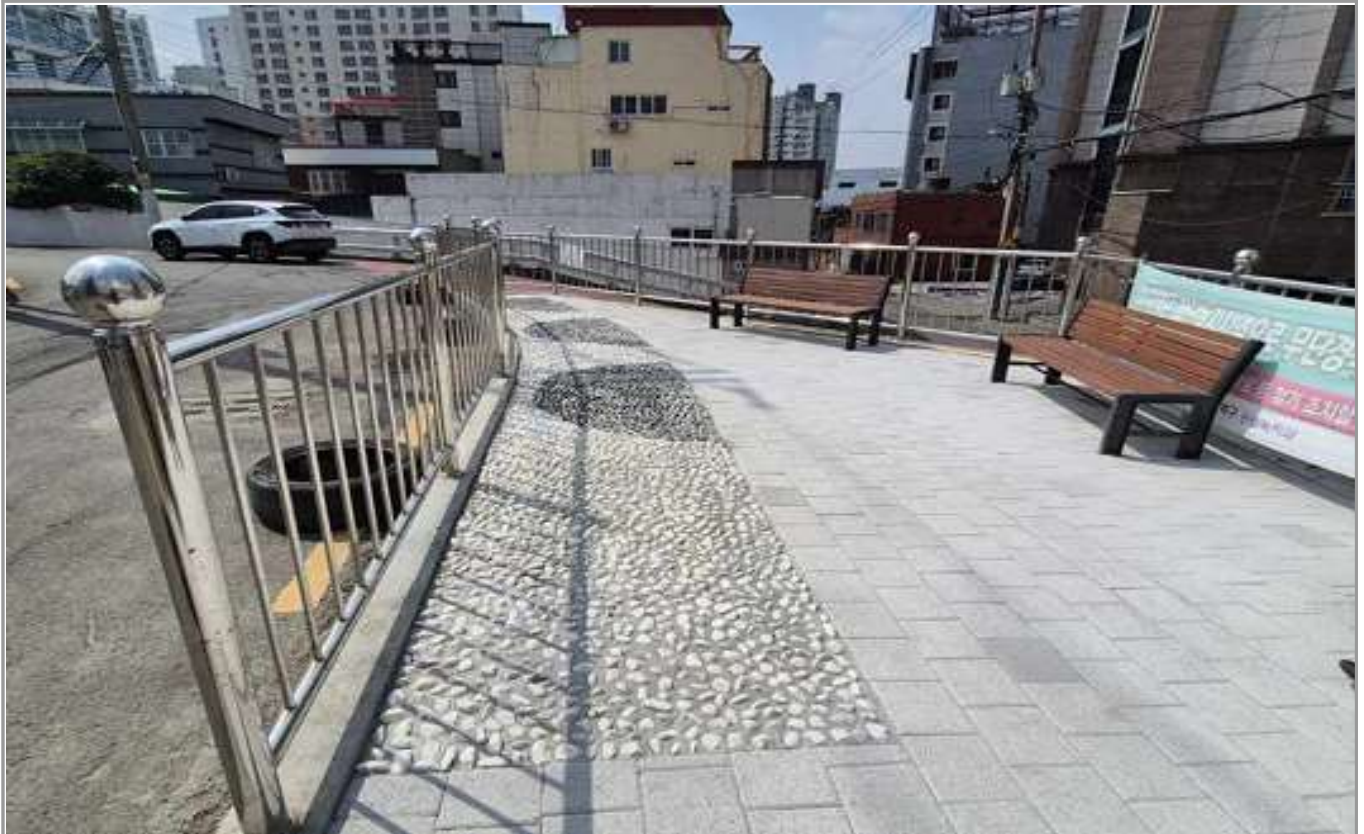


현장사진

만덕 회전교차로 교통섬 화단 조성



위 치 도

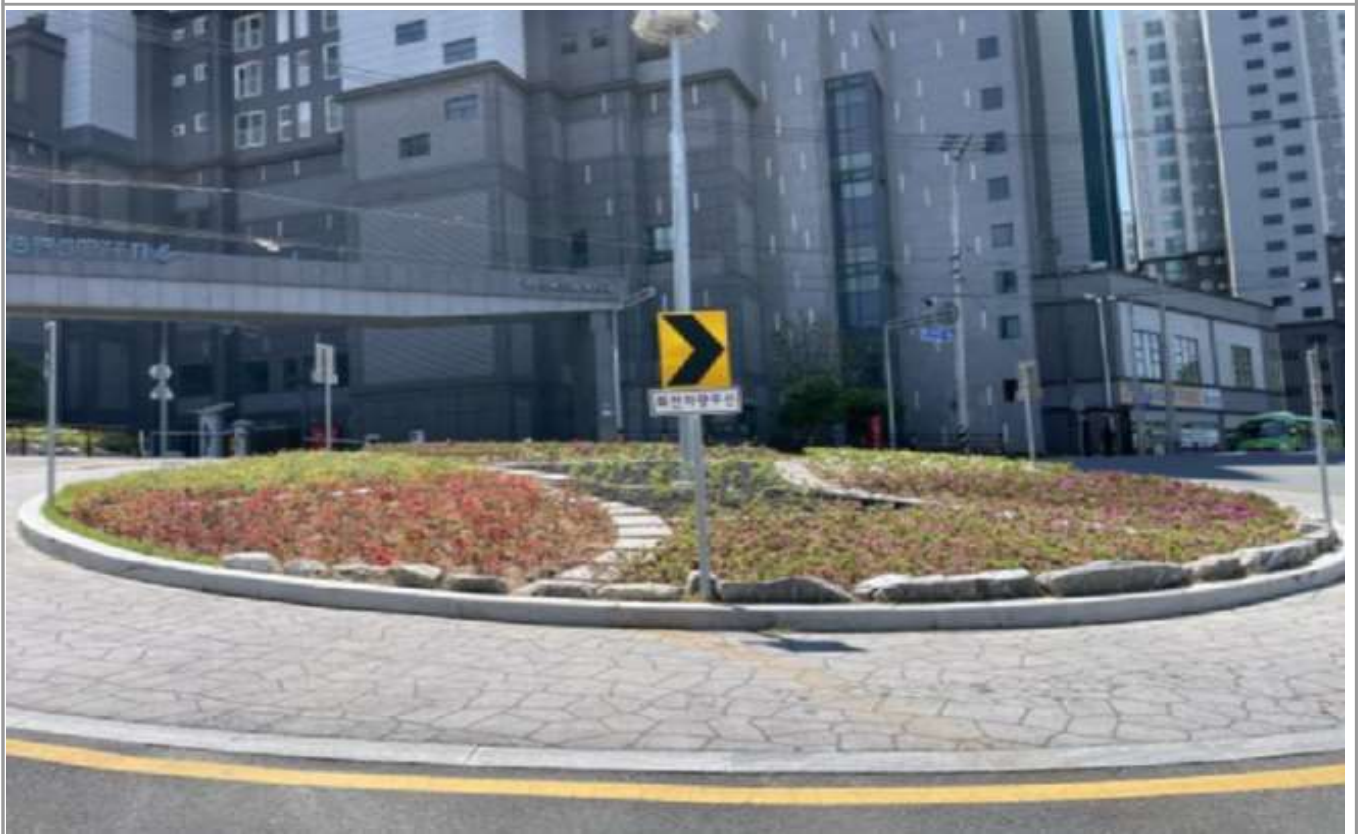

현장사진

구포 유림아파트 회전교차로 교통섬 화단 조성




위 치 도



현장사진

만덕고갯길 도시숲(테마정원) 조성사업 2차

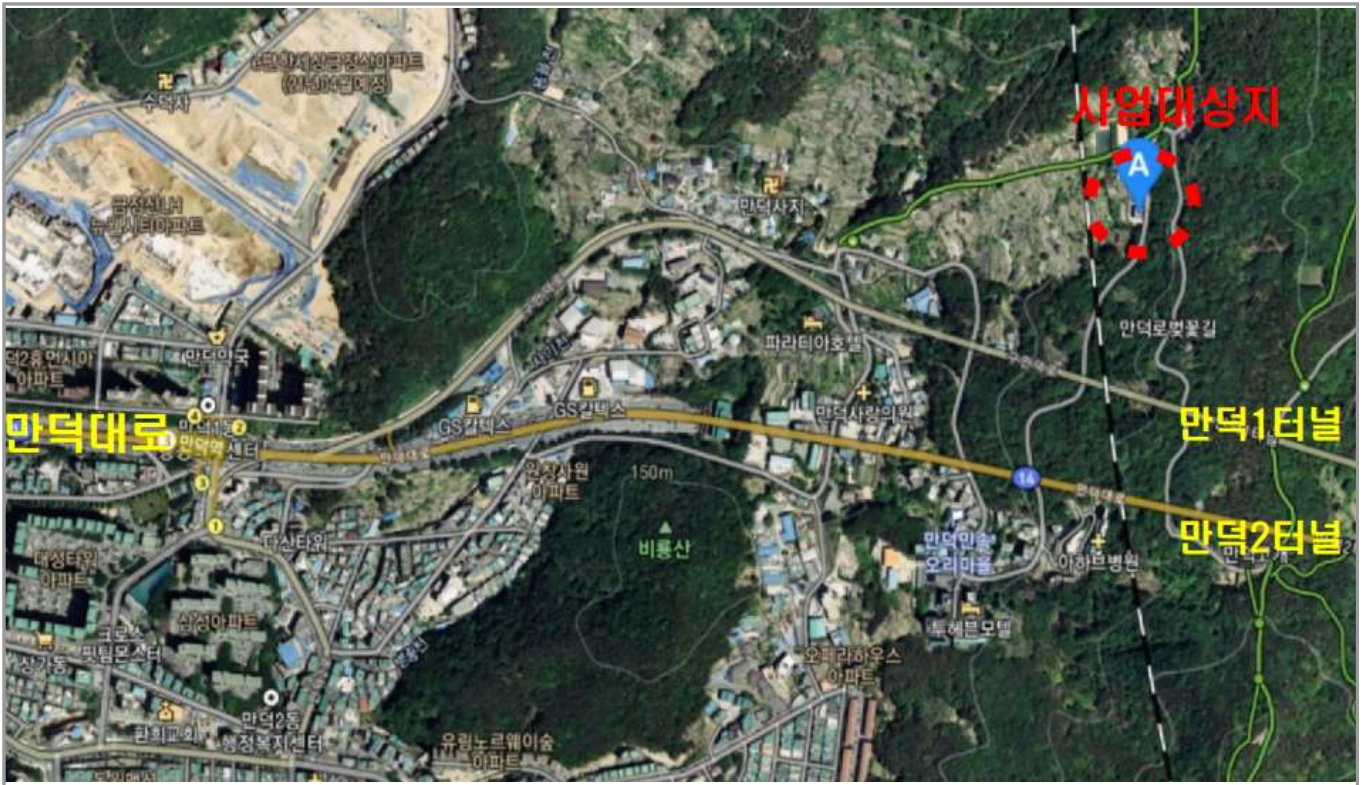


위 치 도



현장사진

만덕3로 주민센터 조성

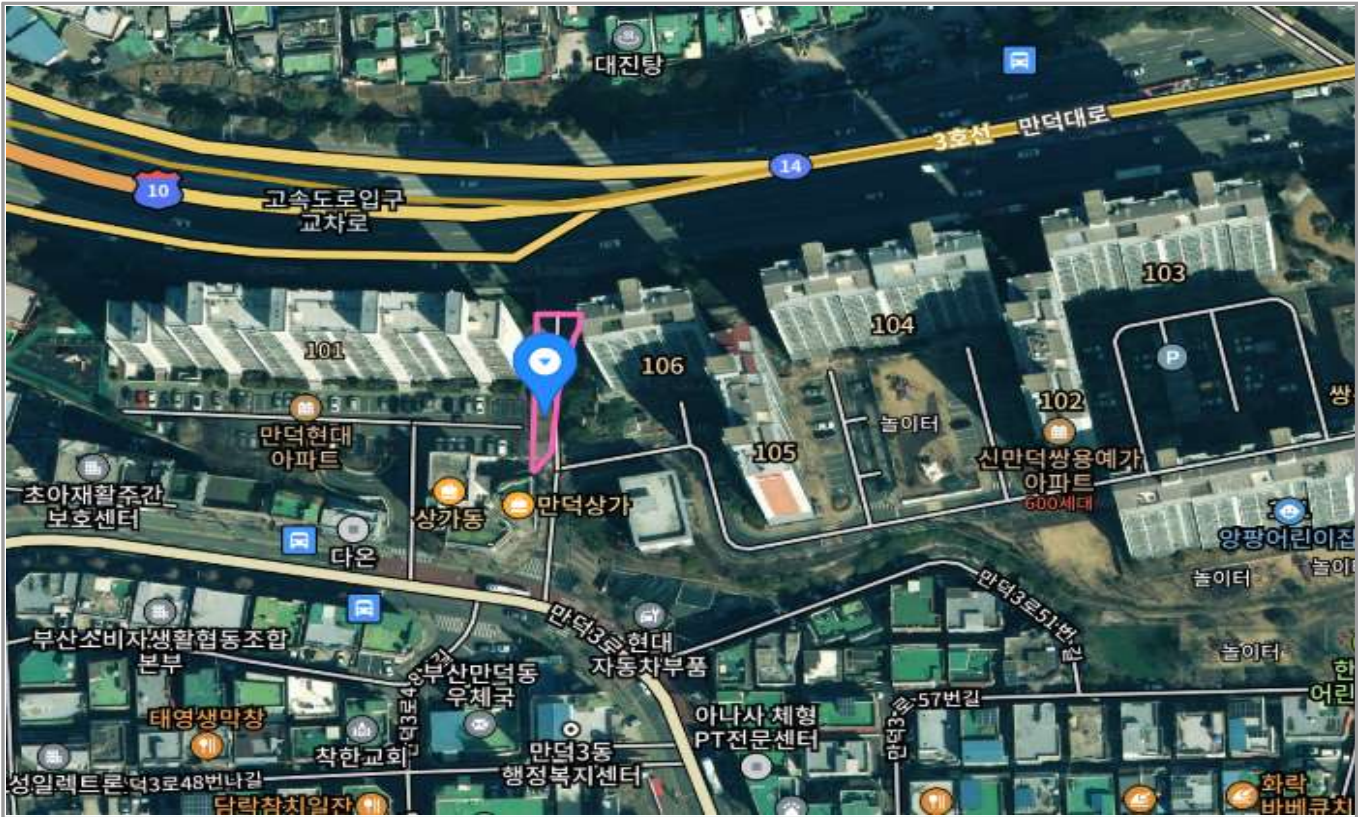

위 치 도



현장사진

만덕대로 거리환경 정비



위 치 도



현장사진

5-6

화명~화명생태공원 연결 화명장미브릿지 건설

주관 부서	미래전략실 전략사업팀	협조 부서	건설과	市 도로계획과	작성기준 2026.3.31.
	백승거(☎5422)		김보현(☎4692)	장성원(☎888-1352)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기후	신규	시	부산시: 신규사업 사전심사 및 예산확보 등 사업 추진		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023년 ~ 2028년		20,000백만원	정상추진	15%	

1. 정책목표

- 화명생태공원으로의 접근성 증대로 구민 복지 및 화명동 상권 활성화
- (임기 내) 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 추진 및 원활한 사업추진을 위한 예산확보

2. 사업개요

- 위 치 : 화명동 2279번지(중앙공원) ~ 1718-13번지(화명생태공원)
- 규 모 : 보행교량 설치 L=336.9m, B=4~6m(문화공간 설치)
- 사 업 비 : 20,000백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업내용 : 화명생태공원~화명중앙공원, 상업지역을 연결하는 보행교량 설치

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	20,000	-	20,000	-	80	-	1,000	18,920	-	80	-	80	-	-	-
국비	10,000	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-
시비	9,920	-	9,920	-	-	-	1,000	8,920	-	-	-	-	-	-	-
구비	80	-	80	-	80	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-
기타 (민간)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 총 소요예산 변경 : 22,000백만원 → 20,000백만원

- ▷ 변경사유 : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 완료에 따른 사업비 반영
- ▷ 투자계획 변경 : '25년 실시설계 추진을 위한 시 예산 편성 계획 반영

4. 추진계획

추진사항	2023				2024				2025				2026				임기후	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
사업 기본 계획 및 타당성 조사 용역		■	■	■														
사업 추진 관련 관계기관 업무협의					■	■	■	■	■	■	■	■						
신규사업 사전심사 및 예산확보													■	■				
사전행정절차 이행 및 실시설계 용역														■	■	■		
본 공사 추진																	■	■

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23년	○ 추진계획 수립('23.1.26.) ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료('23. 3. ~ 12.)	
'24년	○ 화명 장미브릿지 사업 추진 관련 국회 출장('24.11.6.) ○ 화명 장미브릿지 업무협의 관련 市 공원도시과 방문('24.12.17.)	
'25년	○ 낙동강유역 5대 정원공원 통합디자인 기본구상 수립 용역 내 화명 장미브릿지 반영 검토('26. 4월 용역 준공 예정.)	
'26년	○ 화명 장미브릿지 업무협의 관련 市 공원도시과 방문('26.2.11.)	

6. 문제점 및 대책

- 사업 추진을 위한 예산확보 방안 마련 필요
- ▣ 市 관련 부서(도로계획과) 업무 협의 및 예산확보를 위한 지속 노력

7. 향후 추진계획

- 2026. 상반기 : 「낙동강 유역 5대 정원·공원 통합디자인 기본구상 수립 용역」 내 화명장미브릿지 사업 반영 추진
