


작업 중 석면비산 측정 결과값

부산광역시 북구 만덕1로 72
만덕초등학교

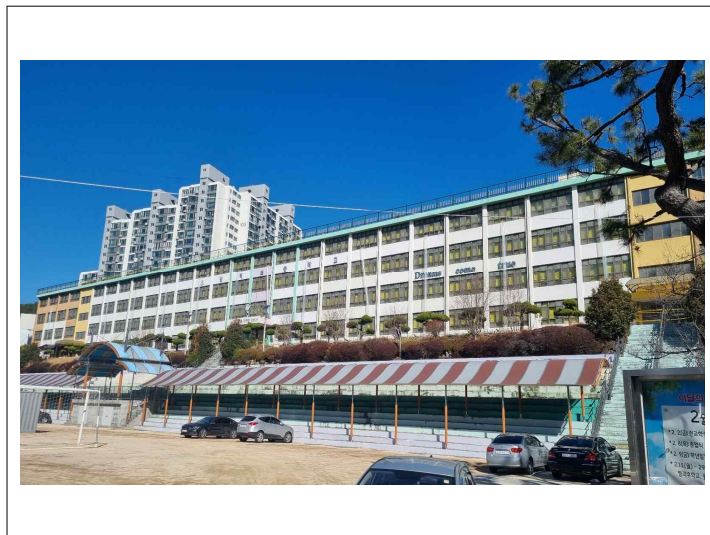

(주)반도보건환경기술원
Bando Technology of Health and Environment

<석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과>

측정일자 : 2024년 2월 26일
분석일자 : 2024년 2월 26일

시료 번호	측정 지점 [†]	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/min)	측정 일시	측정결과 (개/㎠)	검출석면종류 (초과여부)*	분석계수 시야수
S-1	부지경계선1	BD-총-3 / 1ea	10.47	08:11 ~ 12:11	0.000	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-2	부지경계선2	BD-총-1 / 1ea	10.48	08:15 ~ 12:15	0.001	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-3	부지경계선3	BD-총-2 / 1ea	10.43	08:18 ~ 12:18	0.000	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-4	부지경계선4	BD-총-4 / 1ea	10.38	08:21 ~ 12:21	0.000	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-5	폐기물보관소1	BD-총-55 / 1ea	9.90	08:26 ~ 10:26	0.001	종류파악불가 (기준 미만)	150
S-6	폐기물보관소2	BD-총-51 / 1ea	9.78	08:28 ~ 10:28	0.001	종류파악불가 (기준 미만)	150

※ 허용기준* : 0.01 개/㎠ 측정지점[†] : 바닥면에서 0.3m ~ 1.5m 높이 채취매체 : 공극 크기 0.8 μm, 직경 25 mm 멤브레인 여과지

상기와 같이 귀 기관에서 의뢰한 석면해체·제거 사업장의 석면농도 분석결과를 통보합니다.

2024년 02월 27일

(주)반도보건환경기술원 대표이사

